


印刷サンプル集

その気にさせるオフィスワークの充実した建設業務ソフト

プロファイル シリーズ

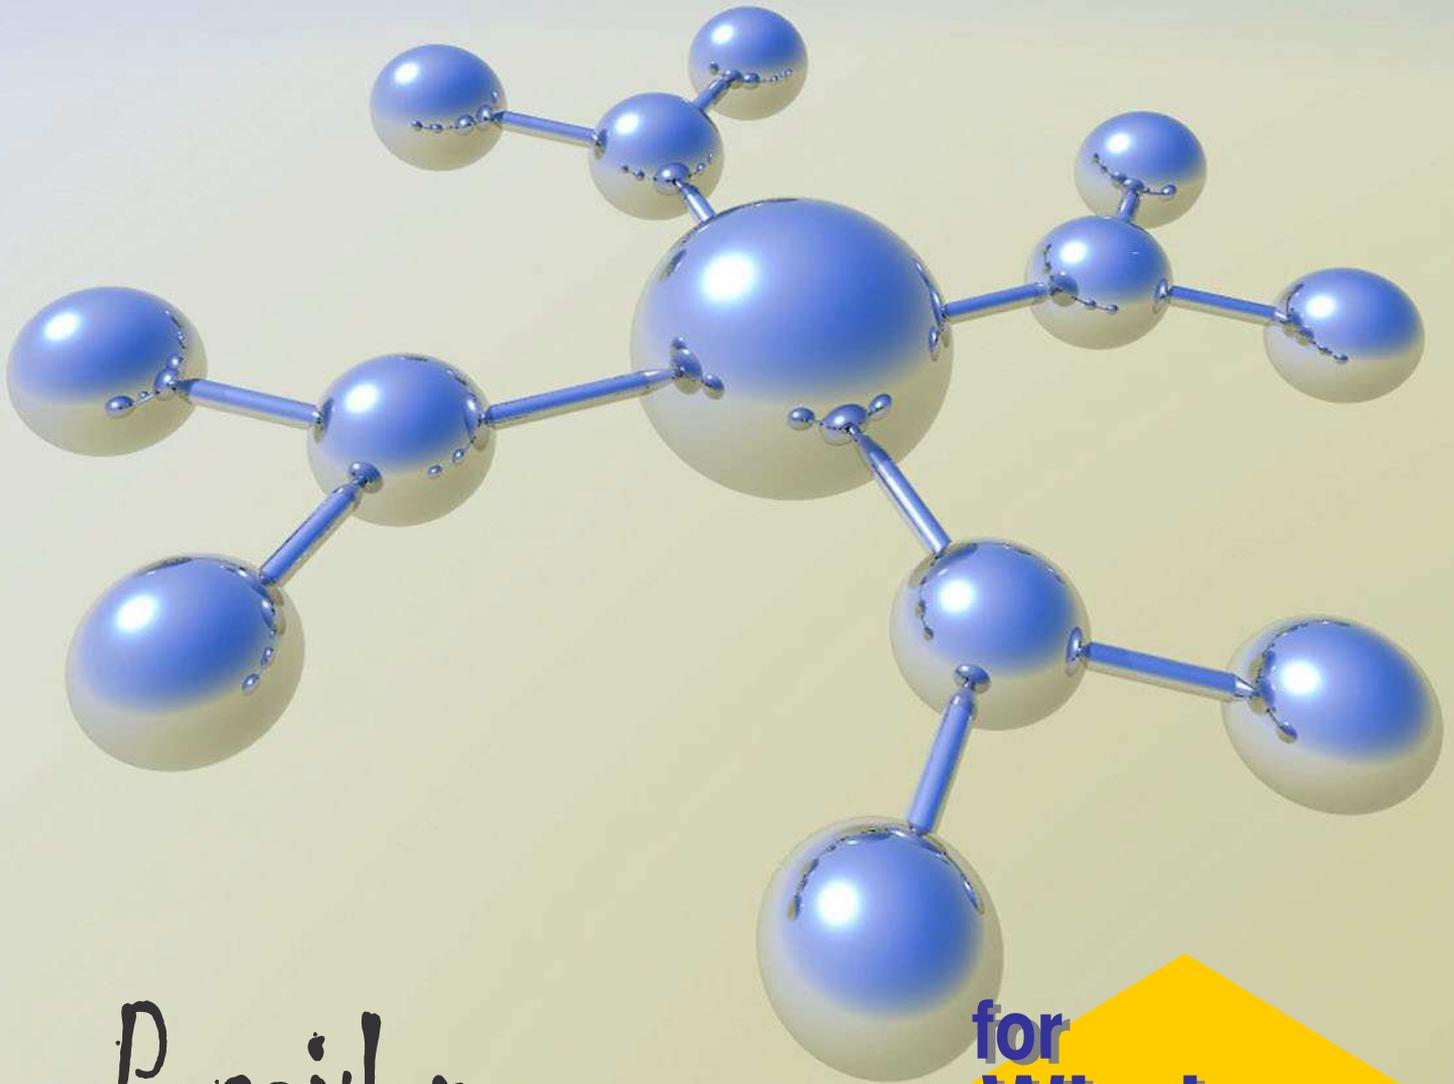

Poseidon
工事原価管理

for
Windows

※Windowsはマイクロソフトの登録商標です。

ポセイドン原価資料一覧(目次)

資料分類	No.	名称	用紙	方向	余白				頁
					上	下	左	右	
実行予算	01	工事実行予算書	A3	縦	10	10	10	8	2
	02	作業単価内訳書	A4	横	10	10	10	9	3
	03	作業単価内訳書(取引別)	A4	横	10	10	10	9	4
	04	作業単価内訳書(取引別)(金額抜)	A4	横	10	10	10	9	5
予算管理	05	予算管理表	A3	横	10	10	10	10	6
工事台帳	06	現場別工事台帳	A3	縦	10	10	15	10	7
	07	作業月報	A4	縦	10	10	8	6	8
	08	作業日報(金額)	A3	縦	10	10	15	10	9
	09	作業日報(数量)	A3	縦	10	10	15	10	10
	10	現場別工事台帳<予算との差分>	A3	縦	10	10	15	10	11
出面管理	11	現場別労務台帳	A3	縦	10	10	25	10	12
	12	氏名別労務台帳	A3	縦	10	10	20	10	13
	13	氏名別賃金台帳	A3	縦	10	10	8	6	14
	14	労務管理台帳	A3	横	15	5	6	5	15
出来高管理	15	出来高報告書	A3	縦	10	10	25	10	16
	16	出来高明細書	A4	縦	10	10	8	6	17
	17	出来高・作業実績対比報告書	A3	横	20	10	10	10	18
工事総括	18	工事一覧表	A3	横	10	10	20	10	19
	19	工事総括一覧表	A3	縦	10	10	25	10	20
取引先管理	20	取引先集計一覧表	A3	縦	10	10	25	10	21
	21	取引先明細書	A4	横	10	10	20	10	22
	22	取引先商品一覧表	A4	縦	10	10	15	10	23
	23	取引先現場商品一覧表	A4	横	10	10	20	10	24
進捗管理	24	工事別集計一覧表	A3	横	10	10	10	10	25
	25	工事進捗率一覧表	A3	横	10	10	15	10	26
現場別取引先管理	26	現場別取引先集計一覧表	A3	横	10	10	25	10	27
	27	現場別取引先明細書	A4	横	10	10	20	10	28
	28	現場別商品一覧表	A4	横	10	10	20	10	29
	29	工種別商品一覧表	A4	横	10	10	20	10	30
	30	細目別商品一覧表	A4	横	10	10	20	10	31
	31	原区別商品一覧表	A4	横	10	10	20	10	32
気象管理	32	気象・海象月報	A3	縦	10	10	20	10	33
工事分析	33	工事分析報告書	A3	横	10	10	20	10	34
その他	34	発注者一覧表	A3	横	10	10	15	10	35
	35	取引先一覧表	A3	横	10	10	25	10	36
	36	社員名簿一覧表	A3	横	10	10	10	10	37
	37	社員単価一覧表	A3	横	10	10	10	10	38
	38	工種マスター一覧表	A3	横	10	10	30	10	39
	39	細目マスター一覧表	A3	横	10	10	30	10	40
	40	商品単価一覧表	A4	縦	10	10	25	10	41
	41	費目別作業単価表	A4	横	10	10	15	10	42
	42	工種別作業単価表	A4	横	10	10	15	10	43

工 事 実 行 予 算 書

2013年5月5日
1 / 3 ページ

工事No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

No.	工 種	No.	細 目	実 行 予 算				実 行 予 算 費 目 内 訳				
				単位	数 量	単 価	金 額	材料費	労務費	外注費	経費1	経費2
0902	盛土工事		(直工)				198,275,000	1,691,700	13,459,000	11,132,790	171,682,560	308,950
							59.0%	0.9%	6.8%	5.6%	86.6%	0.2%
		9002	場内切盛土	m3	20000	485	9,700,000	78,260	1,235,800	8,076,990	0	308,950
							2.9%	0.8%	12.7%	83.3%	0.0%	3.2%
		9003	客土積込み運搬工	m3	95000	1,610	152,950,000	989,800	9,783,200	2,445,800	139,731,200	0
							45.5%	0.6%	6.4%	1.6%	91.4%	0.0%
		9004	客土敷き均し締固め工	m3	95000	375	35,625,000	623,640	2,440,000	610,000	31,951,360	0
							10.6%	1.8%	6.8%	1.7%	89.7%	0.0%
0903	土留め擁壁工事		(直工)				44,885,065	11,599,913	23,652,200	7,675,567	1,957,385	0
							13.4%	25.8%	52.7%	17.1%	4.4%	0.0%
		9005	構造物掘削工	m3	924	545	503,580	10,270	102,200	25,550	365,560	0
							0.1%	2.0%	20.3%	5.1%	72.6%	0.0%
		9006	構造物埋戻し工	m3	543	450	244,350	11,480	59,000	14,750	159,120	0
							0.1%	4.7%	24.1%	6.0%	65.1%	0.0%
		9007	基礎栗石工	m3	123	13,470	1,656,810	823,330	566,800	141,700	124,980	0
							0.5%	49.7%	34.2%	8.6%	7.5%	0.0%
		9008	均しコンクリート工	m3	60	20,583	1,235,000	859,500	300,400	0	75,100	0
							0.4%	69.6%	24.3%	0.0%	6.1%	0.0%
		9009	コンクリート工	m3	402	25,557	10,274,167	5,910,700	1,683,900	2,258,592	420,975	0
							3.1%	57.5%	16.4%	22.0%	4.1%	0.0%
		9010	型枠工	m2	1710	9,582	16,386,698	928,098	12,167,200	3,041,800	249,600	0
							4.9%	5.7%	74.3%	18.6%	1.5%	0.0%
		9011	鉄筋工	t	32	185,782	5,945,035	1,379,860	3,552,300	888,075	124,800	0
							1.8%	23.2%	59.8%	14.9%	2.1%	0.0%
		9012	足場工	空m3	1560	3,279	5,115,250	265,200	3,780,200	945,050	124,800	0
							1.5%	5.2%	73.9%	18.5%	2.4%	0.0%
		9013	裏込め栗石工	m3	207	17,025	3,524,175	1,411,475	1,440,200	360,050	312,450	0
							1.0%	40.1%	40.9%	10.2%	8.9%	0.0%
0904	運搬設備工事		(仮設)				17,147,190	12,373,830	846,000	211,500	3,715,860	0
							5.1%	72.2%	4.9%	1.2%	21.7%	0.0%
		9014	仮設道路土工	m3	1517	2,220	3,367,740	32,740	342,400	85,600	2,907,000	0
							1.0%	1.0%	10.2%	2.5%	86.3%	0.0%
		9015	仮設道路砂利敷き均し工	m3	2655	5,190	13,779,450	12,341,090	503,600	125,900	808,860	0
							4.1%	89.6%	3.7%	0.9%	5.9%	0.0%
0905	仮設電気設備工事		(仮設)				4,059,950	1,356,050	2,074,800	518,700	110,400	0
							1.2%	33.4%	51.1%	12.8%	2.7%	0.0%
		9016	受電設備工	式	1	490,900	490,900	211,000	135,600	33,900	110,400	0
							0.1%	43.0%	27.6%	6.9%	22.5%	0.0%
		9017	変電設備工	式	1	144,950	144,950	65,450	63,600	15,900	0	0
							0.0%	45.2%	43.9%	11.0%	0.0%	0.0%
		9018	高圧幹線設備工	式	1	380,350	380,350	140,600	191,800	47,950	0	0
							0.1%	37.0%	50.4%	12.6%	0.0%	0.0%
		9019	低圧幹線設備工	式	1	803,750	803,750	400,000	323,000	80,750	0	0
							0.2%	49.8%	40.2%	10.0%	0.0%	0.0%
		9020	動力照明設備工	式	1	2,240,000	2,240,000	539,000	1,360,800	340,200	0	0
							0.7%	24.1%	60.8%	15.2%	0.0%	0.0%
0907	安全衛生設備工事		(仮設)				1,630,000	479,000	920,800	230,200	0	0
							0.5%	29.4%	56.5%	14.1%	0.0%	0.0%
		9021	安全対策費	式	1	1,630,000	1,630,000	479,000	920,800	230,200	0	0
							0.5%	29.4%	56.5%	14.1%	0.0%	0.0%

作業単価内訳書

2013年5月5日
1 / 1 ページ

19981201 ○○盛土及び土留め擁壁工事
0902 盛土工事
9002 場内切盛土

作業数量: 20000 m3
作業単価: 485 円 / m3

原 区	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	工数
	材料費							
	消耗工具		式	1	78,260	78,260	(株)△△商事	
	小 計					78,260		
	労務費							
	工長		人	9	23,200	208,800	(株)○○建設	
	普通作業員		人	65	15,800	1,027,000	(株)○○建設	
	小 計					1,235,800		
	外注費							
	ブルドーザ		h	453	17,830	8,076,990	(株)◇◇重機	
	小 計					8,076,990		
	経費2							
	下請け経費		式	1	308,950	308,950	(株)○○建設	
	小 計					308,950		
	合 計					9,700,000		0

作業単価内訳書

2013年5月5日
1 / 13 ページ

20030101 ○○舗装工事
209 (株)○○建設

(取引先)

原 区	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	工数
	管路土工					2,168,002		
	機械掘削工					2,168,002		
労務費						1,722,712		
	人件費	特殊運転手	人	28	21,700	606,316		
	人件費	普通作業員	人	29.7	16,400	487,080		
	人件費	土木一般世話役	人	8.6	25,200	216,216		
	人件費	一般運転手	人	19.4	18,500	359,640		
	人件費	特殊作業員	人	2.7	19,800	53,460		
経費1						445,290		
	バックホウ	バックホウ 山積0.28(平積0.20)	時間	152	1,840	279,752		
	ダンプトラック	ダンプトラック 4t	日	23.7	5,170	122,615		
	タイヤ損料(ダンプ)	4t 普通 タイヤ損料	日	23.7	683	16,198		
	ブルドーザ・レーキドーザ	ブルドーザ(排ガス)普通 15t	時間	3.4	660	2,226		
	ブルドーザ・レーキドーザ	ブルドーザ(排ガス)普通 15t	時間	3.4	6,550	22,099		
	締固め機械	タンバ60~100kg	日	2.7	889	2,400		
	管布設工					706,427		
	塩化ビニール管					706,427		
材料費						8,030		
	下水道資材	塩ビ管滑材	Kg	9.3	860	8,030		

作業単価内訳書

2013年5月5日

1 / 13 ページ

20030101 ○○舗装工事
209 (株)○○建設

(取引先)
(金額抜)

原 区	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	工数
	管路土工							
	機械掘削工							
労務費								
	人件費	特殊運転手	人	28				
	人件費	普通作業員	人	29.7				
	人件費	土木一般世話役	人	8.6				
	人件費	一般運転手	人	19.4				
	人件費	特殊作業員	人	2.7				
経費1								
	バックホウ	バックホウ 山積0.28(平積0.20)	時間	152				
	ダンプトラック	ダンプトラック 4t	日	23.7				
	タイヤ損料(ダンプ)	4t 普通 タイヤ損料	日	23.7				
	ブルドーザ・レーキドーザ	ブルドーザ(排ガス)普通 15t	時間	3.4				
	ブルドーザ・レーキドーザ	ブルドーザ(排ガス)普通 15t	時間	3.4				
	締固め機械	タンバ°60~100kg	日	2.7				
	管布設工							
	塩化ビニール管							
材料費								
	下水道資材	塩ビ管滑材	Kg	9.3				

予算管理表

2013年5月6日
1 / 6 ページ

工事No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

5月分

項目	単位	実行予算			実績出来高			出来高内訳					予算と実績の差						
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	材料費	労務費	外注費	経費1	経費2	材料費	労務費	外注費	経費1	経費2	金額	
No. 001 (直工)								1,691,700	13,459,000	11,132,790	171,682,560	308,950							
盛土工事				198,275,000			59,227,441	58,573,066	433,875	108,000	112,500	0	▲56,881,366	13,025,125	11,024,790	171,570,060	308,950	139,047,559	
				59.0%			29.9%	3462.4%	3.2%	1.0%	0.1%	0.0%	-3362.4%	96.8%	99.0%	99.9%	100.0%	70.1%	
場内切盛土	m3	20000	485	9,700,000	20150	818	16,502,515	16,263,140	193,875	27,000	18,500	0	▲16,184,880	1,041,925	8,049,990	▲18,500	308,950	▲6,802,515	
				2.9%	100.8%	168.7%	170.1%	20780.9%	15.7%	0.3%	0.0%	0.0%	-20680.9%	84.3%	99.7%	0.0%	100.0%	-70.1%	
客土積み込み運搬工	m3	95000	1,610	152,950,000	95150	448	42,671,426	42,309,926	210,000	81,000	70,500	0	▲41,320,126	9,573,200	2,364,800	139,660,700	0	110,278,574	
				45.5%	100.2%	27.8%	27.9%	4274.6%	2.1%	3.3%	0.1%	0.0%	-4174.6%	97.9%	96.7%	99.9%	0.0%	72.1%	
客土敷き均し締固め工	m3	95000	375	35,625,000	95150	0	53,500	0	30,000	0	23,500	0	623,640	2,410,000	610,000	31,927,860	0	35,571,500	
				10.6%	100.2%	0.0%	0.2%	0.0%	1.2%	0.0%	0.1%	0.0%	100.0%	98.8%	100.0%	99.9%	0.0%	99.8%	
No. 002 (直工)								11,599,913	23,652,200	7,675,567	1,957,385	0							
土留め擁壁工事				44,885,065			5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	6,199,913	23,652,200	7,675,567	1,957,385	0	39,485,065	
				13.4%			12.0%	46.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	53.4%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	88.0%	
構造物掘削工	m3	924	545	503,580	200	0	0	10,270	102,200	25,550	365,560	0	10,270	102,200	25,550	365,560	0	503,580	
				0.1%	21.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
構造物埋戻し工	m3	543	450	244,350	100	0	0	11,480	59,000	14,750	159,120	0	11,480	59,000	14,750	159,120	0	244,350	
				0.1%	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
基礎栗石工	m3	123	13,470	1,656,810	60	0	0	823,330	566,800	141,700	124,980	0	823,330	566,800	141,700	124,980	0	1,656,810	
				0.5%	48.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
均しコンクリート工	m3	60	20,583	1,235,000		0	0	859,500	300,400	0	75,100	0	859,500	300,400	0	75,100	0	1,235,000	
				0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	
コンクリート工	m3	402	25,557	10,274,167		0	5,400,000	5,910,700	1,683,900	2,258,592	420,975	0	510,700	1,683,900	2,258,592	420,975	0	4,874,167	
				3.1%	0.0%	0.0%	52.6%	91.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.6%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	47.4%	
型枠工	m2	1710	9,582	16,386,698		0	0	928,098	12,167,200	3,041,800	249,600	0	928,098	12,167,200	3,041,800	249,600	0	16,386,698	
				4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	

現場別工事台帳

2013年5月6日
1 / 1 ページ

8月分

工事名 19981201 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/08/20

発注者 002 東京都

工事価格 336,000,000

第1回変更 0

現場代理人 遠藤 雅之

第2回変更 0

着工年月日 1998/08/01

主任技術者 遠藤 雅之

変更後金額 336,000,000

完成年月日 1999/03/31

担当者 川島 五郎

実行予算 306,021,911

No.	日付	工種	細目	原区	使用	取引先名	数量	単価	単位	金額
1	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	材料費	下水道資材塩ビ管滑材	株△△商事	100.00	860.00	Kg	86,000
2	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	長島 茂男	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
3	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	近藤 雅彦	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
4	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	大川 一郎	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
5	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	山田 太郎	株○○建設	1.00	10,000.00	人	10,000
6	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	吉田 栄一	株○○建設	1.00	10,000.00	人	10,000
7	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	外注費	作業員	(株)○○組	3.00	9,000.00	人	27,000
8	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	経費1	軽油	株△△商事	50.00	70.00	リットル	3,500
9	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	経費1	バックホウ車両98-01	株○○建設	1.00	15,000.00	日	15,000
10	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	材料費	目潰し砂利100mm	(株)◇◇建設	123.00	5,300.00	m3	651,900
11	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	高橋 秀樹	株○○建設	1.00	8,000.00	人	8,000
12	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	香川 雅彦	株○○建設	1.00	12,000.00	人	12,000
13	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	大隅 賢治	株○○建設	1.00	12,000.00	人	12,000
14	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	井上 大祐	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
15	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	経費1	ブルドーザ車両54-35	株○○建設	1.00	20,000.00	日	20,000
16	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	経費1	ダンプトラック車両35-69	株○○建設	1.00	30,000.00	日	30,000
17	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	経費1	軽油	株△△商事	100.00	70.00	リットル	7,000
18	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	材料費	目潰し砂利100mm	(株)◇◇建設	123.00	5,300.00	m3	651,900
19	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	材料費	長靴	(有)▽▽商店	3.00	1,500.00	足	4,500
20	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	労務費	長島 茂男	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
21	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	労務費	近藤 雅彦	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
22	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	労務費	大川 一郎	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
23	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	労務費	山田 太郎	株○○建設	1.00	10,000.00	人	10,000
24	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	労務費	吉田 栄一	株○○建設	1.00	10,000.00	人	10,000
25	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	外注費	作業員	(株)○○組	3.00	9,000.00	人	27,000
26	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	経費1	軽油	株△△商事	50.00	70.00	リットル	3,500
27	08/03 (月)	盛土工事	客土積み込み運搬	経費1	バックホウ車両98-01	株○○建設	1.00	15,000.00	日	15,000
28	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	労務費	高橋 秀樹	株○○建設	1.00	8,000.00	人	8,000
29	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	労務費	香川 雅彦	株○○建設	1.00	12,000.00	人	12,000
30	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	労務費	井上 大祐	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
31	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	経費1	ブルドーザ車両54-35	株○○建設	1.00	20,000.00	日	20,000
32	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	経費1	バックホウ車両98-02	株○○建設	1.00	15,000.00	日	15,000
33	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	経費1	ダンプトラック車両35-69	株○○建設	1.00	30,000.00	日	30,000
34	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷	経費1	軽油	株△△商事	50.00	70.00	リットル	3,500
35	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	材料費	電線	○○電機商会(株)	1.00	24,000.00	式	24,000
36	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	材料費	装柱材	○○電機商会(株)	1.00	42,000.00	式	42,000
37	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	材料費	柱上遮断機	○○電機商会(株)	1.00	76,000.00	台	76,000
38	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	労務費	長島 茂男	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
39	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	労務費	近藤 雅彦	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
40	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	労務費	大川 一郎	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
41	08/04 (火)	仮設電気設備工	受電設備工	外注費	作業員	(株)○○組	5.00	9,000.00	人	45,000
42	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	材料費	電線	○○電機商会(株)	1.00	24,000.00	式	24,000
43	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	材料費	装柱材	○○電機商会(株)	1.00	42,000.00	式	42,000
44	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	材料費	柱上遮断機	○○電機商会(株)	1.00	76,000.00	台	76,000
45	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	労務費	長島 茂男	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
46	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	労務費	近藤 雅彦	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
47	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	労務費	大川 一郎	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
48	08/05 (水)	仮設電気設備工	変電設備工	外注費	作業員	(株)○○組	5.00	9,000.00	人	45,000
49	08/07 (金)	盛土工事	客土敷き均し締	労務費	長島 茂男	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
50	08/07 (金)	盛土工事	客土敷き均し締	労務費	近藤 雅彦	株○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
51	08/07 (金)	盛土工事	客土敷き均し締	経費1	ブルドーザ車両54-35	株○○建設	1.00	20,000.00	日	20,000
52	08/07 (金)	盛土工事	客土敷き均し締	経費1	軽油	株△△商事	50.00	70.00	リットル	3,500
							計			2,340,300
							実行金額累計			2,340,300
							実行金額残高			303,681,611

	費目別合計	費目別実行金額累計
材料費	1,678,300	1,678,300
労務費	332,000	332,000
外注費	144,000	144,000
経費1	186,000	186,000
経費2	0	0
縦合計	2,340,300	2,340,300

作業月報

2013年5月6日
1 / 1 ページ

19981101 □□工事

対象期間2000/03/01～2000/03/31

日付	材料費	労務費	外注費	経費1	経費2	日計
03/01 (水)	7,000	30,000	0	15,000	0	52,000
03/02 (木)	0	30,000	0	17,500	3,800	51,300
03/03 (金)	0	30,000	0	27,200	0	57,200
03/04 (土)	15,000	30,000	0	18,000	0	63,000
03/05 (日)	0	30,000	25,000	18,000	0	73,000
03/06 (月)	0	45,000	0	0	0	45,000
03/07 (火)	0	45,000	0	0	0	45,000
03/08 (水)	87,000	45,000	0	0	0	132,000
03/09 (木)	0	45,000	0	30,000	0	75,000
03/10 (金)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/12 (日)	0	30,000	25,000	0	0	55,000
03/13 (月)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/14 (火)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/15 (水)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/16 (木)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/17 (金)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/20 (月)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/21 (火)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/22 (水)	0	30,000	50,000	0	0	80,000
03/23 (木)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/24 (金)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/27 (月)	55,000	30,000	0	0	0	85,000
03/28 (火)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/29 (水)	0	30,000	0	0	0	30,000
03/30 (木)	0	30,000	0	0	9,000	39,000
要素計	164,000	810,000	100,000	125,700	12,800	1,212,500

作業日報

工事名	19981201 ○○盛土及び土留め擁壁工事	天候 晴/曇	作業日	1998年8月1日 (土)	担当者	川島 五郎
-----	------------------------	-----------	-----	---------------	-----	-------

作業記録	台風・低気圧の状況 その他の記事
(1) 盛土工事 作業完了。 (2) 運搬設備工事 作業50%完了。	特に無し。

No.	工種	原区	使用	取引先	時間	早出	深夜	普休	普深	法定	法深	単位	数量	単価	金額	備考
01	盛土工事	材料費	下水道資材塩ビ管滑	(株)△△商事								Kg	100.00	860.00	86,000	
03	盛土工事	労務費	長島 茂男	(株)○○建設	8.0							人	1.00	15,000.00	15,000	
04	盛土工事	労務費	近藤 雅彦	(株)○○建設	8.0							人	1.00	15,000.00	15,000	
05	盛土工事	労務費	大川 一郎	(株)○○建設	8.0							人	1.00	15,000.00	15,000	
06	盛土工事	労務費	山田 太郎	(株)○○建設	8.0							人	1.00	10,000.00	10,000	
07	盛土工事	労務費	吉田 栄一	(株)○○建設	8.0							人	1.00	10,000.00	10,000	
09	盛土工事	外注費	作業員	(株)○○組								人	3.00	9,000.00	27,000	
11	盛土工事	経費1	軽油	(株)△△商事								リットル	50.00	70.00	3,500	
12	盛土工事	経費1	バックホウ車両98-01	(株)○○建設								日	1.00	15,000.00	15,000	
21	運搬設備工事	材料費	目潰し砂利100mm	(株)◇◇建設								m3	123.00	5,300.00	651,900	
23	運搬設備工事	労務費	高橋 秀樹	(株)○○建設	8.0							人	1.00	8,000.00	8,000	
24	運搬設備工事	労務費	香川 雅彦	(株)○○建設	8.0							人	1.00	12,000.00	12,000	
25	運搬設備工事	労務費	大隅 賢治	(株)○○建設	8.0							人	1.00	12,000.00	12,000	
26	運搬設備工事	労務費	井上 大祐	(株)○○建設	8.0							人	1.00	15,000.00	15,000	
28	運搬設備工事	経費1	ブルドーザ車両54-35	(株)○○建設								日	1.00	20,000.00	20,000	
29	運搬設備工事	経費1	ダンプトラック車両35-69	(株)○○建設								日	1.00	30,000.00	30,000	
30	運搬設備工事	経費1	軽油	(株)△△商事								リットル	100.00	70.00	7,000	

	予算金額	累計金額		残高金額		日報金額
材料費	30,250,593	737,900	2.4%	29,512,693	97.6%	737,900
労務費	44,668,480	112,000	0.3%	44,556,480	99.7%	112,000
外注費	21,537,157	27,000	0.1%	21,510,157	99.9%	27,000
経費1	190,191,561	75,500	0.0%	190,116,061	100.0%	75,500
経費2	49,352,209	0	0.0%	49,352,209	100.0%	0
合計	336,000,000	952,400	0.3%	335,047,600	99.7%	952,400

現場別工事台帳<予算との差分>

2013年5月6日
1 / 1 ページ

8月分

工事名 19981201 ○○盛土及び土留め擁壁工事
発注者 002 東京都

対象期間1998/08/01~1998/08/31

工事価格 336,000,000
第1回変更 0
第2回変更 0
変更後金額 336,000,000

着工年月日 1998/08/01
完成年月日 1999/03/31
現場代理人 遠藤 雅之
主任技術者 遠藤 雅之
担当者 川島 五郎

実行予算 306,021,911

No.	日付	工種	細目	原区	使用	取引先名	数量	単価	単位	金額
1	08/31 (月)	機械土工(土砂)	ブルドーザ掘削押	労務費	石橋 孝明	(株)○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
2	08/31 (月)	機械土工(土砂)	ブルドーザ掘削押	労務費	伊東 四郎	(株)○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
3	08/31 (月)	機械土工(土砂)	ブルドーザ掘削押	労務費	伊東 弘幸	(株)○○建設	1.00	15,000.00	人	15,000
4	08/31 (月)	機械土工(土砂)	ブルドーザ掘削押	経費1	バックホウ車両98-01	(株)○○建設	1.00	15,000.00	日	15,000
5	08/31 (月)	機械土工(土砂)	ブルドーザ掘削押	経費1	軽油	(株)△△商事	50.00	70.00	リットル	3,500
							計<差分>			63,500
							実行金額累計<差分>			2,340,300
							実行金額残高<差分>			303,681,611

	費目別合計<差分>	費目別実行金額累計<差分>
材料費	0	1,678,300
労務費	45,000	332,000
外注費	0	144,000
経費1	18,500	186,000
経費2	0	0
縦合計	63,500	2,340,300

現場別労務台帳

2013年5月6日
1 / 1 ページ

9月分

工事名 19981205 ○○地区土地区画整理工事

対象期間1998/09/01～1998/09/30

No.	氏名	平日出勤(d)	早出残業(h)	深夜(h)	普休出(d)	普休深(h)	法定休出(d)	法定休深(h)	出勤日数(d)	休み(d)
1	石橋 孝明	26日	3.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
2	伊東 弘幸	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
3	井上 大祐	23日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	23日	0日
4	上島 幸則	22日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	22日	0日
5	内村 春男	22日	1.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	22日	0日
6	浦島 太郎	22日	1 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	22日	0日
7	江川 伸彦	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
8	遠藤 雅之	26日	0 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
9	大川 一郎	25.5日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	25.5日	0日
10	大隅 賢治	26日	1.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
11	近江 俊彦	25日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	25日	0日
12	大森 俊夫	23日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	23日	0日
13	岡野 宗男	22日	3 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	22日	0日
14	香川 雅彦	26日	3.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
15	川口 弘	26日	3 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
16	川島 五郎	26日	1.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
17	北島 良夫	26日	3 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
18	清原 則夫	26日	1.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
19	近藤 雅彦	25日	1 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	25日	0日
20	西城 克典	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	1日
21	定岡 稔	26日	3 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
22	沢田 義幸	26日	3 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
23	杉田 二郎	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	1日
24	鈴木 健亮	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
25	鈴木 宏明	26日	0 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	1日
26	関根 務	26日	0 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
27	高橋 秀樹	26日	3.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
28	立川 光夫	26日	0 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
29	田中 美佐子	26日	4 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
30	田原 俊夫	26日	1 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
31	勅使河原 毅	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
32	賭場 一朗	26日	1.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
33	長島 茂男	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
34	長野 聡	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
35	中村 政利	26日	1 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
36	南原 杉雄	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
37	西川 則夫	26日	3 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
38	野口 一郎	26日	1 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
39	野村 義男	26日	0 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	1日
40	原 達彦	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
41	原田 大二郎	26日	1 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
42	平野 正明	26日	3.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
43	藤田 ともよ	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
44	伏見 昭典	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
45	藤原 寛	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
46	星野 仙一	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
47	松本 玲人	26日	0 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
48	山口 桃子	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
49	山田 太郎	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
50	山本 丈治	26日	2 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
51	吉田 栄一	26日	2.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	26日	0日
合計		1301.5日	100.5 h	0 h	0日	0 h	0日	0 h	1301.5日	4日

氏名別労務台帳

2013年5月6日
1 / 1 ページ

社員ID 048

9月分

氏名 石橋 孝明

対象期間1998/09/01~1998/09/30

No.	日付	工事名	時間	早出残業	深夜	普休出	普休深	法定休出	法定休深	休み	休み項目
1	09/01 (火)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	1.5 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
2	09/02 (水)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	2 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
3	09/03 (木)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
4	09/04 (金)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
5	09/05 (土)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
6	09/07 (月)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
7	09/08 (火)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
8	09/09 (水)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
9	09/10 (木)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
10	09/11 (金)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
11	09/12 (土)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
12	09/14 (月)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
13	09/15 (火)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
14	09/16 (水)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
15	09/17 (木)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
16	09/18 (金)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
17	09/19 (土)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
18	09/21 (月)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
19	09/22 (火)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
20	09/23 (水)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
21	09/24 (木)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
22	09/25 (金)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
23	09/26 (土)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
24	09/28 (月)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
25	09/29 (火)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
26	09/30 (水)	19981205 ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	
合計			208 h	3.5 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0日	

出勤日数	平日出勤	普休出	法定休出
26日	26日	0日	0日

欠勤	有給休暇	私病欠	特別休暇	代休	振替休日
0日	0日	0日	0日	0日	0日

氏名別賃金台帳

2013年5月6日
1 / 1 ページ

社員ID 048

9月分

氏名 石橋 孝明

対象期間1998/09/01～1998/09/30

No.	日付	工事名	時間	早出残業	深夜	普休出	普休深	法定休出	法定休深	休み	休み項目	賃金
1	09/01 (火)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	1.5 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		18,515
2	09/02 (水)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	2 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		19,687
3	09/03 (木)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
4	09/04 (金)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
5	09/05 (土)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
6	09/07 (月)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
7	09/08 (火)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
8	09/09 (水)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
9	09/10 (木)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
10	09/11 (金)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
11	09/12 (土)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
12	09/14 (月)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
13	09/15 (火)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
14	09/16 (水)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
15	09/17 (木)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
16	09/18 (金)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
17	09/19 (土)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
18	09/21 (月)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
19	09/22 (火)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
20	09/23 (水)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
21	09/24 (木)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
22	09/25 (金)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
23	09/26 (土)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
24	09/28 (月)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
25	09/29 (火)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
26	09/30 (水)	19981205: ○○地区土地区画整理工事	8 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		15,000
合計			208 h	3.5 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 日		398,202

出勤日数	平日出勤	普休出	法定休出
26日	26日	0日	0日

欠勤	有給休暇	私病欠	特別休暇	代休	振替休日
0日	0日	0日	0日	0日	0日

労務管理台帳

2013年5月6日
1 / 5 ページ

1998年 9月分

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	日数
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	残業	
001 石橋 孝明 211.5 h	◎ 8.0 1.5	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 3.5 h
002 伊東 四郎 0.0 h																																0日 0.0 h
003 伊東 弘幸 210.0 h	8.0	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 2.0 h
004 井上 大祐 186.0 h	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0				8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		23日 2.0 h	
005 上島 幸則 178.0 h	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0		8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0				8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		22日 2.0 h	
006 内村 春男 177.5 h	8.0		◎ 8.0 1.5	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0				8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		22日 1.5 h	
007 浦島 太郎 177.0 h	8.0	8.0	◎ 8.0 1.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		22日 1.0 h
008 江川 伸彦 210.0 h	8.0	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 2.0 h
009 遠藤 雅之 208.0 h	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 0.0 h
010 大川 一郎 206.5 h	◎ 8.0 1.5	◎ 8.0 1.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	● 4.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 2.5 h
011 大隅 賢治 209.5 h	◎ 8.0 1.5	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 1.5 h
012 大曾根 秀 0.0 h																															0日 0.0 h	
013 近江 俊彦 202.5 h		◎ 8.0 1.5	◎ 8.0 1.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		25日 2.5 h
014 大森 俊夫 186.0 h	8.0	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		23日 2.0 h
015 岡野 宗男 179.0 h	◎ 8.0 2.0	8.0	◎ 8.0 1.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		22日 3.0 h
016 沖野 忠志 0.0 h																															0日 0.0 h	
017 香川 雅彦 211.5 h	◎ 8.0 1.5	8.0	◎ 8.0 2.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 3.5 h
018 片桐 悟 0.0 h																															0日 0.0 h	
019 川口 弘 211.0 h	◎ 8.0 2.0	8.0	◎ 8.0 1.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0		26日 3.0 h

出来高報告書

2013年5月6日
1 / 1 ページ

工事No. 19981201

8月分

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/08/31

工種	細目	単位	設計数量	出来高			進捗率			単価	金額
				今回	累計	残高	今回	累計	残高		
盛土工事											
	場内切盛土	m3	20000	500	600	19400	2.50%	3.00%	97.00%	485	242,500
	客土積込み運搬工	m3	95000	500	600	94400	0.53%	0.63%	99.37%	1,610	805,000
	客土敷き均し締固め工	m3	95000	500	600	94400	0.53%	0.63%	99.37%	375	187,500
土留め擁壁工事											
	構造物掘削工	m3	924	100	100	824	10.82%	10.82%	89.18%	545	54,500
	構造物埋戻し工	m3	543	50	50	493	9.21%	9.21%	90.79%	450	22,500
	基礎栗石工	m3	123	10	10	113	8.13%	8.13%	91.87%	13,470	134,700
	均しコンクリート工	m3	60			60	0.00%	0.00%	100.00%	20,583	0
	コンクリート工	m3	402			402	0.00%	0.00%	100.00%	25,557	0
	型枠工	m2	1710			1710	0.00%	0.00%	100.00%	9,582	0
	鉄筋工	t	32			32	0.00%	0.00%	100.00%	185,782	0
	足場工	空m3	1560			1560	0.00%	0.00%	100.00%	3,279	0
	裏込め栗石工	m3	207			207	0.00%	0.00%	100.00%	17,025	0
運搬設備工事											
	仮設道路土工	m3	1517			1517	0.00%	0.00%	100.00%	2,220	0
	仮設道路砂利敷き均し工	m3	2655			2655	0.00%	0.00%	100.00%	5,190	0
仮設電気設備工事											
	受電設備工	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	490,900	0
	変電設備工	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	144,950	0
	高圧幹線設備工	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	380,350	0
	低圧幹線設備工	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	803,750	0
	動力照明設備工	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	2,240,000	0
安全衛生設備工事											
	安全対策費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	1,630,000	0
仮設建物工事											
	事務所・宿舎・倉庫	m2	124			124	0.00%	0.00%	100.00%	23,005	0
	作業員宿舎	m2	248			248	0.00%	0.00%	100.00%	18,845	0
加工設備工事											
	鉄筋加工工場	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	708,000	0
現場管理費											
	電力用水費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	751,630	0
	運搬費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	1,425,920	0
	労務管理費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	726,500	0
	法定福利費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	4,744,976	0
	補償費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	250,000	0
	租税公課	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	184,000	0
	地代家賃	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	1,960,000	0
	保険料	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	2,682,330	0
	従業員給与手当	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	11,779,680	0
	従業員賞与	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	4,397,280	0
	従業員退職金	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	970,110	0
	福利厚生費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	662,600	0
	事務用品費	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	1,255,500	0
一般管理費											
	資金利息	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	834,000	0
	本支店経費	%	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	24,892,000	0
利益											
	利益	式	1			1	0.00%	0.00%	100.00%	4,252,089	0
予算金額			336,000,000				0.43%	0.50%	99.50%	出来高合計	1,446,700

出来高明細書

2013年5月6日

1 / 1 ページ

工事No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/12/31

No.	日付	工種	細目	単位	数量
		0902 盛土工事	9002 場内切盛土	m3	
001	08/01 (土)				500.0
002	09/01 (火)				500.0
003	10/01 (木)				19,150.0
				計	20,150.0
		0902 盛土工事	9003 客土積込み運搬工	m3	
001	08/01 (土)				500.0
002	09/01 (火)				500.0
003	10/01 (木)				19,150.0
004	11/01 (日)				50,000.0
005	12/01 (火)				25,000.0
				計	95,150.0
		0902 盛土工事	9004 客土敷き均し締固め工	m3	
001	08/01 (土)				500.0
002	09/01 (火)				500.0
003	10/01 (木)				19,150.0
004	11/01 (日)				50,000.0
005	12/01 (火)				25,000.0
				計	95,150.0
		0903 土留め擁壁工事	9005 構造物掘削工	m3	
001	08/01 (土)				100.0
002	09/01 (火)				100.0
				計	200.0
		0903 土留め擁壁工事	9006 構造物埋戻し工	m3	
001	08/01 (土)				50.0
002	09/01 (火)				50.0
				計	100.0
		0903 土留め擁壁工事	9007 基礎栗石工	m3	
001	08/01 (土)				10.0
002	09/01 (火)				50.0
				計	60.0

出来高・作業実績対比報告書

2013年5月6日
1 / 5 ページ

工事No. 19981201
工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

8月分
対象期間1998/08/01～1998/08/31

工種	細目	単位	単価	設計		今回			累計			残高		
				数量	金額	数量	金額	%	数量	金額	%	数量	金額	%
盛土工事														
	場内切盛土	m3	485	20000	9,700,000	500	242,500	2.50%	600	291,000	3.00%	19400	9,409,000	97.00%
							196,500	2.02%		196,500	2.02%		9,503,500	97.97%
							46,000	0.48%		94,500	0.98%		94,500	0.97%
	客土積込み運搬工	m3	1,610	95000	152,950,000	500	805,000	0.52%	600	966,000	0.63%	94400	151,984,000	99.36%
							766,900	0.50%		766,900	0.50%		152,183,100	99.49%
							38,100	0.02%		199,100	0.13%		199,100	0.13%
	客土敷き均し締固め工	m3	375	95000	35,625,000	500	187,500	0.52%	600	225,000	0.63%	94400	35,400,000	99.36%
							53,500	0.15%		53,500	0.15%		35,571,500	99.84%
							134,000	0.37%		171,500	0.48%		171,500	0.48%
					198,275,000		1,235,000	0.62%		1,482,000	0.74%		196,793,000	99.25%
							1,016,900	0.51%		1,016,900	0.51%		197,258,100	99.48%
							218,100	0.11%		465,100	0.23%		465,100	0.23%
土留め擁壁工事														
	構造物掘削工	m3	545	924	503,580	100	54,500	10.82%	100	54,500	10.82%	824	449,080	89.17%
								0.00%			0.00%		503,580	100.00%
							54,500	10.82%		54,500	10.82%		54,500	10.83%
	構造物埋戻し工	m3	450	543	244,350	50	22,500	9.20%	50	22,500	9.20%	493	221,850	90.79%
								0.00%			0.00%		244,350	100.00%
							22,500	9.20%		22,500	9.20%		22,500	9.21%
	基礎栗石工	m3	13,470	123	1,656,810	10	134,700	8.13%	10	134,700	8.13%	113	1,522,110	91.86%
								0.00%			0.00%		1,656,810	100.00%
							134,700	8.13%		134,700	8.13%		134,700	8.14%
	均しコンクリート工	m3	20,583	60	1,235,000		0	0.00%		0	0.00%	60	1,235,000	100.00%
								0.00%			0.00%		1,235,000	100.00%
							0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%
	コンクリート工	m3	25,557	402	10,274,167		0	0.00%		0	0.00%	402	10,274,167	100.00%
								0.00%			0.00%		10,274,167	100.00%
							0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%
	型枠工	m2	9,582	1710	16,386,698		0	0.00%		0	0.00%	1710	16,386,698	100.00%
								0.00%			0.00%		16,386,698	100.00%
							0	0.00%		0	0.00%		0	0.00%

工事一覧表

2013年5月6日
1 / 1 ページ

5月分

No.	発注者	工事名	着工日	完成日		初回金額	第1回変更	第2回変更	変更後金額	現場管理者	残高=価格-実績	比率		
001	〇〇建設	19981101 □□工事	1998/05/01	1998/09/30 153日間	工事価格	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	現場代理人 遠藤 雅之	価格	10,000,000		
					消費税	400,000	100,000	0	500,000	主任技術者 遠藤 雅之	実績	6,176,900	61.8%	
					請負金額	8,400,000	2,100,000	0	10,500,000	担当者 川島 五郎	残高	3,823,100	38.2%	
002	東京都	19981201 〇〇盛土及び土留め擁壁工事	1998/08/01	1999/03/31 243日間	工事価格	336,000,000	0	0	336,000,000	現場代理人 遠藤 雅之	価格	336,000,000		
					消費税	16,800,000	0	0	16,800,000	主任技術者 遠藤 雅之	実績	66,236,341	19.7%	
					請負金額	352,800,000	0	0	352,800,000	担当者 川島 五郎	残高	269,763,659	80.3%	
003	東京都	19981202 〇〇道路改良工事	1998/09/01	1999/03/31 212日間	工事価格	110,000,000	0	0	110,000,000	現場代理人 遠藤 雅之	価格	110,000,000		
					消費税	5,500,000	0	0	5,500,000	主任技術者 遠藤 雅之	実績	1,587,500	1.4%	
					請負金額	115,500,000	0	0	115,500,000	担当者 川島 五郎	残高	108,412,500	98.6%	
004	岩手県	19981203 〇〇下水道渠布設工事	1998/08/01	1999/03/31 243日間	工事価格	195,000,000	0	0	195,000,000	現場代理人 清原 則夫	価格	195,000,000		
					消費税	9,750,000	0	0	9,750,000	主任技術者 清原 則夫	実績		0.0%	
					請負金額	204,750,000	0	0	204,750,000	担当者 鈴木 宏明	残高	195,000,000	100.0%	
005	岩手県	19981204 〇〇川新水路工事	1997/07/01	1998/12/31 549日間	工事価格	65,000,000	0	0	65,000,000	現場代理人 清原 則夫	価格	65,000,000		
					消費税	3,250,000	0	0	3,250,000	主任技術者 清原 則夫	実績		0.0%	
					請負金額	68,250,000	0	0	68,250,000	担当者 鈴木 宏明	残高	65,000,000	100.0%	
006	宮城県	19981205 〇〇地区土地区画整理工事	1998/05/01	1998/08/31 123日間	工事価格	30,000,000	0	0	30,000,000	現場代理人 遠藤 雅之	価格	30,000,000		
					消費税	1,500,000	0	0	1,500,000	主任技術者 遠藤 雅之	実績	14,067,511	46.9%	
					請負金額	31,500,000	0	0	31,500,000	担当者 川島 五郎	残高	15,932,489	53.1%	
007	宮城県	19981206 △△号〇〇橋交差点改良工事	1998/08/01	1998/12/31 153日間	工事価格	15,000,000	0	0	15,000,000	現場代理人 遠藤 雅之	価格	15,000,000		
					消費税	750,000	0	0	750,000	主任技術者 遠藤 雅之	実績	44,781,200	298.5%	
					請負金額	15,750,000	0	0	15,750,000	担当者 川島 五郎	残高	▲29,781,200	-198.5%	
008	盛岡市	19981207 〇〇川砂防ダム災害復旧工事	1998/09/01	1998/11/30 91日間	工事価格	20,000,000	0	0	20,000,000	現場代理人 清原 則夫	価格	20,000,000		
					消費税	1,000,000	0	0	1,000,000	主任技術者 清原 則夫	実績		0.0%	
					請負金額	21,000,000	0	0	21,000,000	担当者 鈴木 宏明	残高	20,000,000	100.0%	
009	盛岡市	19981208 △△市〇〇地区歩道工事	1998/11/01	1999/12/31 426日間	工事価格	35,000,000	0	0	35,000,000	現場代理人 内村 春男	価格	35,000,000		
					消費税	1,750,000	0	0	1,750,000	主任技術者 内村 春男	実績		0.0%	
					請負金額	36,750,000	0	0	36,750,000	担当者 近藤 雅彦	残高	35,000,000	100.0%	
010	釜石市	19981209 〇〇市△△地区下水道工事	1998/10/01	1999/03/31 182日間	工事価格	40,000,000	0	0	40,000,000	現場代理人 川島 五郎	価格	40,000,000		
					消費税	2,000,000	0	0	2,000,000	主任技術者 川島 五郎	実績		0.0%	
					請負金額	42,000,000	0	0	42,000,000	担当者 鈴木 宏明	残高	40,000,000	100.0%	
					未成工事	工事価格	854,000,000	2,000,000	0	856,000,000		価格	856,000,000	
						消費税	42,700,000	100,000	0	42,800,000		実績	132,849,452	15.5%
						請負金額	896,700,000	2,100,000	0	898,800,000		残高	723,150,548	84.5%
					完成工事	工事価格	0	0	0	0		価格	0	
						消費税	0	0	0	0		実績	0	0.0%
						請負金額	0	0	0	0		残高	0	0.0%
					総合計	工事価格	854,000,000	2,000,000	0	856,000,000		価格	856,000,000	
						消費税	42,700,000	100,000	0	42,800,000		実績	132,849,452	15.5%
						請負金額	896,700,000	2,100,000	0	898,800,000		残高	723,150,548	84.5%

工事総括一覧表

2013年5月6日
1 / 1 ページ

5月分

発注No.	発注者	工事件数		初回金額	第1回変更	第2回変更	変更後金額	備考
001	〇〇建設	2件	工事価格	8,000,000	2,000,000	0	10,000,000	
			消費税	400,000	100,000	0	500,000	
			請負金額	8,400,000	2,100,000	0	10,500,000	
002	東京都	3件	工事価格	446,000,000	0	0	446,000,000	
			消費税	22,300,000	0	0	22,300,000	
			請負金額	468,300,000	0	0	468,300,000	
003	宮城県	2件	工事価格	45,000,000	0	0	45,000,000	
			消費税	2,250,000	0	0	2,250,000	
			請負金額	47,250,000	0	0	47,250,000	
004	岩手県	8件	工事価格	433,000,000	0	0	433,000,000	
			消費税	21,650,000	0	0	21,650,000	
			請負金額	454,650,000	0	0	454,650,000	
026	盛岡市	2件	工事価格	55,000,000	0	0	55,000,000	
			消費税	2,750,000	0	0	2,750,000	
			請負金額	57,750,000	0	0	57,750,000	
027	一関市	1件	工事価格	20,000,000	0	0	20,000,000	
			消費税	1,000,000	0	0	1,000,000	
			請負金額	21,000,000	0	0	21,000,000	
029	大船渡市	2件	工事価格	22,500,000	0	0	22,500,000	
			消費税	1,125,000	0	0	1,125,000	
			請負金額	23,625,000	0	0	23,625,000	
030	釜石市	2件	工事価格	48,000,000	0	0	48,000,000	
			消費税	2,400,000	0	0	2,400,000	
			請負金額	50,400,000	0	0	50,400,000	
031	北上市	2件	工事価格	62,500,000	0	0	62,500,000	
			消費税	3,125,000	0	0	3,125,000	
			請負金額	65,625,000	0	0	65,625,000	
032	久慈市	1件	工事価格	15,000,000	0	0	15,000,000	
			消費税	750,000	0	0	750,000	
			請負金額	15,750,000	0	0	15,750,000	
033	遠野市	1件	工事価格	25,000,000	0	0	25,000,000	
			消費税	1,250,000	0	0	1,250,000	
			請負金額	26,250,000	0	0	26,250,000	
034	二戸市	1件	工事価格	65,000,000	0	0	65,000,000	
			消費税	3,250,000	0	0	3,250,000	
			請負金額	68,250,000	0	0	68,250,000	
035	花巻市	1件	工事価格	50,000,000	0	0	50,000,000	
			消費税	2,500,000	0	0	2,500,000	
			請負金額	52,500,000	0	0	52,500,000	
036	水沢市	1件	工事価格	15,000,000	0	0	15,000,000	
			消費税	750,000	0	0	750,000	
			請負金額	15,750,000	0	0	15,750,000	
計		29件	工事価格	1,310,000,000	2,000,000	0	1,312,000,000	
			消費税	65,500,000	100,000	0	65,600,000	
			請負金額	1,375,500,000	2,100,000	0	1,377,600,000	

取引先集計一覧表

2013年5月6日
1 / 1 ページ

1998年度分

No.	取引先名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
1	(株)〇〇建設	0	220,000	87,500	30,000	772,000	14,257,511	0	0	0	0	0	0	15,367,011
2	(株)△△商事	0	0	0	0	1,410,700	36,387,206	20,550,166	0	0	0	0	0	58,348,072
3	〇〇塗装工業(株)	0	1,520,520	650,000	0	250,000	700,000	0	0	0	0	0	0	3,120,520
4	凸凹工場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	〇〇塗装工業(株)	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	1,500,000
6	(株)〇〇舗装	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	800,000
7	(株)〇〇印刷所	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	30,000
8	(株)△△建設	0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	360,000
9	〇〇鉄工所株式会社	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	20,000,000
10	〇〇ブロック(株)	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	0	750,000
11	(株)〇〇工業	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	240,000
12	(有)〇〇運送	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	1,200
13	(有)▽▽商店	5,000	0	0	0	4,500	0	0	5,000	0	0	0	0	14,500
14	(株)◇◇建設	530,000	0	0	0	1,303,800	0	0	530,000	0	0	0	0	2,363,800
15	(株)〇〇組	0	90,000	0	90,000	144,000	0	0	0	90,000	0	0	0	414,000
16	〇〇火薬店(株)	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	1,500,000
17	(有)◇◇無線	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000
18	(有)〇〇本店	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000
19	(株)〇〇工業	0	75,000	0	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	225,000
20	(株)〇〇写真	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	250,000
21	〇〇金属工業(株)	0	0	5,500	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	11,000
22	(株)△△組	0	110,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	330,000
23	(株)△△モーター	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	300,000
24	〇〇食堂(有)	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	60,000
25	(有)◇◇商店	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	1,000,000
26	△△建機(株)	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	500,000
27	(株)システム△△	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	2,500,000
28	(株)〇〇印刷所	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,200,000
29	〇〇そばや	0	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	45,000
30	スーパー〇〇(株)	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000
31	〇〇レモン(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	プロファイル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	〇〇電機商会(株)	50,000	0	0	0	284,000	0	0	50,000	0	0	0	0	384,000
月間合計		18,776,100	2,215,520	2,771,500	505,000	4,169,000	51,344,717	22,584,166	18,776,100	475,000	0	0	0	121,617,103

取引先明細書

2013年5月6日
1 / 2 ページ

取引先No. 133

取引先名 株△△商事

対象期間1998/08/01～1998/08/31

No.	工 事 名				摘 要	数量	単位	単 価	金 額	
	日 付	工 種	細 目	要素						
19981201	〇〇盛土及び土留め擁壁工事									
001	08/01	(土)	盛土工事	場内切盛土	材料費	下水道資材塩ビ管滑材	100.00	Kg	860.00	86,000
002	08/01	(土)	盛土工事	場内切盛土	経費1	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
003	08/01	(土)	運搬設備工事	仮設道路土工	経費1	軽油	100.00	リットル	70.00	7,000
004	08/03	(月)	盛土工事	客土積込み運搬工	経費1	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
005	08/03	(月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷き	経費1	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
006	08/07	(金)	盛土工事	客土敷き均し締固	経費1	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
007	08/31	(月)	機械土工(土砂)	ブルドーザ掘削押土	経費1	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
	小 計									110,500
19981202	〇〇道路改良工事									
008	08/07	(金)	伐採除根工	伐採除根工	材料費	軽油	500.00	リットル	70.00	35,000
	小 計									35,000
20030101	〇〇舗装工事									
009	08/01	(土)	管路土工	機械掘削工	材料費	石 材土砂(購入土) *	300.00	m3	60.00	18,000
010	08/01	(土)	管路土工	機械掘削工	材料費	石 材路床置換土(岩ズリ) k	250.00	m ²	1,300.00	325,000
011	08/05	(水)	管路土工	機械掘削工	材料費	石 材土砂(購入土) *	300.00	m3	60.00	18,000
012	08/05	(水)	管路土工	機械掘削工	材料費	石 材路床置換土(岩ズリ) k	250.00	m ²	1,300.00	325,000
	小 計									686,000
20030102	△△舗装工事									
013	08/10	(月)	管布設工	*	材料費	組立マンホール1号躯体	5.00	個	28,400.00	142,000
014	08/10	(月)	管布設工	*	材料費	組立マンホール1号斜壁	5.00	個	24,400.00	122,000
015	08/10	(月)	管布設工	*	材料費	組立マンホール調整リング	5.00	個	5,120.00	25,600
016	08/12	(水)	管布設工	*	材料費	組立マンホール1号躯体	5.00	個	28,400.00	142,000
017	08/12	(水)	管布設工	*	材料費	組立マンホール1号斜壁	5.00	個	24,400.00	122,000

取引先商品一覧表

2013年5月6日
1 / 2 ページ

取引先No. 133

取引先名 (株)△△商事

対象期間1998/08/01~1998/09/30

No.	摘要	数量	単位	単価	金額
001	As舗装機械Asフイニッシャ	3.00	日	90,400.00	271,200
002	アスファルト合材	350.00	m3	8,050.00	2,817,500
003	アスファルト混合剤	10.00	t	7,800.00	78,000
004	アスファルト類AS乳剤	880.00	m3	49.00	43,120
005	ガソリン	100.00	リットル	108.00	10,800
006	カッターブレード	10.00	枚	29,900.00	299,000
007	ジャッキベースA15	441.00	個月	59.00	26,019
008	メタルフォーム MF3015	1,170.00	枚月	126.00	147,420
009	モルタル 1:2	150.00	m3	19,000.00	2,850,000
010	塩化ビニール管	139.00	本	15,000.00	2,085,000
011	下水道資材塩ビ管滑材	100.00	Kg	860.00	86,000
012	割栗石	500.00	m3	5,300.00	2,650,000
013	筋違A14	396.00	本月	41.00	16,236
014	軽油	1,020.00	リットル	70.00	71,400
015	合板足場材	18.00	枚	3,630.00	65,340
016	人孔鉄蓋勾配受型 T-20	21.00	個	53,600.00	1,125,600
017	生コンクリート 13.5N/mm2	150.00	m3	12,000.00	1,800,000
018	生コンクリート 24N/mm2	150.00	m3	13,300.00	1,995,000
019	生コンクリート18-8-40 k	350.00	m3	12,600.00	4,410,000
020	石 材クラッシャーラン 50mm以下	311.00	m3	2,000.00	622,000
021	石 材クラッシャーランC-40K	269.00	m3	2,000.00	538,000
022	石 材砂 k	986.00	m3	3,100.00	3,056,600
023	石 材土砂(購入土) *	820.00	m3	60.00	49,200
024	石 材粒調砕石 M-40 k	80.00	m3	2,450.00	196,000
025	石 材路床置換土(岩スリ) k	600.00	m ²	1,300.00	780,000
026	切込み砂利	200.00	m3	4,400.00	880,000
027	組立マンホール1号躯体	10.00	個	28,400.00	284,000
028	組立マンホール1号斜壁	28.00	個	24,400.00	683,200
029	組立マンホール調整リング	21.00	個	5,120.00	107,520
030	鳥居枠A405	216.00	枠月	138.00	29,808
031	鉄筋 SD35	10.00	t	38,500.00	385,000
032	鉄筋コンクリートU型	150.00	個	1,500.00	225,000
033	電線	1.00	式	24,000.00	24,000
034	布板BKN-6	198.00	枚月	114.00	22,572
035	木材(板材)	150.00	m3	60,000.00	9,000,000
036	木矢板	91.00	枚	81.00	7,371
037	油類・燃料ガソリン *	300.00	リットル	95.00	28,500
038	油類・燃料軽油 *	500.00	リットル	63.00	31,500

取引先現場商品一覧表

2013年5月6日
1 / 1 ページ

取引先No. 133

取引先名 (株)△△商事

対象期間1998/08/01~1998/09/30

No.	工 事 名	摘 要	数量	単位	単 価	金 額
19981201	〇〇盛土及び土留め擁壁工事					
001		As舗装機械Asフィニッシャ	3.00	日	90,400.00	271,200
002		アスファルト合材	350.00	m3	8,050.00	2,817,500
003		アスファルト類AS乳剤	880.00	m3	49.00	43,120
004		ガソリン	100.00	リットル	108.00	10,800
005		カッターブレード	10.00	枚	29,900.00	299,000
006		メタルフォーム MF3015	1,170.00	枚月	126.00	147,420
007		モルタル 1:2	150.00	m3	19,000.00	2,850,000
008		塩化ビニール管	139.00	本	15,000.00	2,085,000
009		下水道資材塩ビ管滑材	100.00	Kg	860.00	86,000
010		割栗石	500.00	m3	5,300.00	2,650,000
011		軽油	520.00	リットル	70.00	36,400
012		合板足場材	18.00	枚	3,630.00	65,340
013		人孔鉄蓋勾配受型 T-20	21.00	個	53,600.00	1,125,600
014		生コンクリート 13.5N/mm2	150.00	m3	12,000.00	1,800,000
015		生コンクリート 24N/mm2	150.00	m3	13,300.00	1,995,000
016		生コンクリート18-8-40 k	350.00	m3	12,600.00	4,410,000
017		石 材クラッシャーラン 50mm以下	311.00	m3	2,000.00	622,000
018		石 材クラッシャーランC-40K	269.00	m3	2,000.00	538,000
019		石 材砂 k	986.00	m3	3,100.00	3,056,600
020		石 材土砂(購入土) *	220.00	m3	60.00	13,200
021		石 材粒調碎石 M-40 k	80.00	m3	2,450.00	196,000
022		石 材路床置換土(岩ズリ) k	100.00	m ²	1,300.00	130,000
023		切込み砂利	200.00	m3	4,400.00	880,000
024		組立マンホール1号斜壁	18.00	個	24,400.00	439,200
025		組立マンホール調整リング	11.00	個	5,120.00	56,320
026		鉄筋 SD35	10.00	t	38,500.00	385,000
027		木材(板材)	150.00	m3	60,000.00	9,000,000
028		油類・燃料ガソリン *	300.00	リットル	95.00	28,500
029		油類・燃料軽油 *	500.00	リットル	63.00	31,500
	小 計					36,068,700
19981202	〇〇道路改良工事					
030		軽油	500.00	リットル	70.00	35,000
	小 計					35,000
20030101	〇〇舗装工事					
031		石 材土砂(購入土) *	600.00	m3	60.00	36,000
032		石 材路床置換土(岩ズリ) k	500.00	m ²	1,300.00	650,000
	小 計					686,000
20030102	△△舗装工事					
033		アスファルト混合剤	10.00	t	7,800.00	78,000
034		ジャッキベースA15	441.00	個月	59.00	26,019
035		筋違A14	396.00	本月	41.00	16,236
036		組立マンホール1号躯体	10.00	個	28,400.00	284,000
037		組立マンホール1号斜壁	10.00	個	24,400.00	244,000
038		組立マンホール調整リング	10.00	個	5,120.00	51,200
039		鳥居枠A405	216.00	枠月	138.00	29,808
040		鉄筋コンクリートU型	150.00	個	1,500.00	225,000
041		電線	1.00	式	24,000.00	24,000
042		布板BKN-6	198.00	枚月	114.00	22,572
043		木矢板	91.00	枚	81.00	7,371
	小 計					1,008,206
	合 計					37,797,906

工事別集計一覧表

工事名	繰越	内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
19981101 □□工事 (○○建設) 153日間 着工 1998/05/01 完成 1998/09/30 工事価格 10,000,000 実行予算 8,500,000		材料費	0	320,500	50,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	570,500
		労務費	0	205,000	87,500	0	175,000	190,000	0	0	0	0	0	0	657,500
		外注費	0	300,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	750,000
		経費1	0	400,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	800,000
		経費2	0	500,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		計	0	1,725,500	737,500	0	425,000	890,000	0	0	0	0	0	0	3,778,000

工事名	繰越	内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
19981201 ○○盛土及び土留め擁壁工事 (東京都) 243日間 着工 1998/08/01 完成 1999/03/31 工事価格 336,000,000 実行予算 306,021,911		材料費	0	0	0	0	1,678,300	35,958,200	20,550,166	0	0	0	0	0	58,186,666
		労務費	0	0	0	0	377,000	0	0	0	0	0	0	0	377,000
		外注費	0	0	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	144,000
		経費1	0	0	0	0	204,500	0	0	0	0	0	0	0	204,500
		経費2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	2,403,800	35,958,200	20,550,166	0	0	0	0	0	58,912,166

工事名	繰越	内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
19981202 ○○道路改良工事 (東京都) 212日間 着工 1998/09/01 完成 1999/03/31 工事価格 110,000,000 実行予算 37,000,300		材料費	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
		労務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000

工事名	繰越	内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
19981203 ○○下水道渠布設工事 (岩手県) 243日間 着工 1998/08/01 完成 1999/03/31 工事価格 195,000,000 実行予算 100		材料費													0
		労務費													0
		外注費													0
		経費1													0
		経費2													0
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工事名	繰越	内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
19981204 ○○川新水路工事 (岩手県) 549日間 着工 1997/07/01 完成 1998/12/31 工事価格 65,000,000 実行予算 100		材料費													0
		労務費													0
		外注費													0
		経費1													0
		経費2													0
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工事進捗率一覧表

2013年5月6日
1 / 2 ページ

5月分

No.	工 事 名	繰越	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
1	19981101 □□工事	予定		10	50	60	90	100							
		当月		4.34%	23.39%	4.47%	38.09%	4.47%							
		累計		4.34%	27.72%	32.19%	70.28%	74.75%							
2	19981201 ○○盛土及び土留め擁壁工事	予定					5	30	40	50	65	75	95	100	
		当月					0.07%	0.43%	0.59%	14.08%	29.54%	14.77%			
		累計					0.07%	0.50%	1.10%	15.17%	44.71%	59.48%			
3	19981202 ○○道路改良工事	予定						10	15	20	30	50	70	100	
		当月													
		累計													
4	19981203 ○○下水道渠布設工事	予定				5	30	70	100						
		当月				2.50%	25.00%	50.00%	22.50%						
		累計				2.50%	27.50%	77.50%	100.00%						
5	19981204 ○○川新水路工事	予定									10	50	100		
		当月									7.50%				
		累計									7.50%				
6	19981205 ○○地区土地区画整理工事	予定		10	20	30	40	50	80	100					
		当月		5.00%	25.00%	5.00%	2.50%	15.00%	30.00%	17.50%					
		累計		5.00%	30.00%	35.00%	37.50%	52.50%	82.50%	100.00%					
7	19981206 △△号○○橋交差点改良工事	予定			10	50	80	100							
		当月			15.00%	40.00%	20.00%	25.00%							
		累計			15.00%	55.00%	75.00%	100.00%							
8	19981207 ○○川砂防ダム災害復旧工事	予定							20	50	70	100			
		当月							15.00%	25.00%	10.00%				
		累計							15.00%	40.00%	50.00%				
9	19981208 △△市○○地区歩道工事	予定					5	10	15	30	70	80	90	100	
		当月													
		累計													
10	19981209 ○○市△△地区下水道工事	予定			10	20	50	100							
		当月													
		累計													
11	19981210 ○○市◇◇トンネル照明設備工事	予定							10	30	50	70	90	100	
		当月													
		累計													
12	19981211 ○○号道路災害工事	予定					10	20	30	40	50	60	70	100	
		当月													
		累計													
13	19981212 ○○道路改良舗装工事	予定			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
		当月													
		累計													
14	19981213 ◇◇舗装修繕工事	予定			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
		当月													
		累計													
15	19981214 △▽水地小堤関連施設工事	予定			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
		当月													
		累計													
16	19981215 国道◇◇号○○川橋梁改築工事	予定			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
		当月													
		累計													

現場別取引先集計一覧表

2013年5月6日
1 / 1 ページ

工事名 19981206 △△号〇〇橋交差点改良工事

取引先	繰越	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計
238 〇〇塗装工業(株)		750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	1,500,000
211 (株)〇〇舗装		400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	800,000
245 (株)〇〇印刷所		15,000	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	30,000
101 (株)△△建設		0	120,000	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	360,000
137 〇〇鉄工所株式会社		10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	20,000,000
151 〇〇ブロック(株)		375,000	0	0	0	0	0	0	375,000	0	0	0	0	750,000
153 (株)〇〇工業		0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	240,000
092 (有)〇〇運送		600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	1,200
013 (有)▽▽商店		5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	10,000
029 (株)◇◇建設		530,000	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	0	0	1,060,000
003 (株)〇〇組		0	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	270,000
198 〇〇火薬店(株)		750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0	1,500,000
129 (有)◇◇無線		5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	10,000,000
090 (有)〇〇本店		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	1,000
250 (株)〇〇工業		0	75,000	0	75,000	0	0	0	0	75,000	0	0	0	225,000
023 (株)〇〇写真		0	0	125,000	0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	250,000
235 〇〇金属工業(株)		0	0	5,500	0	0	0	5,500	0	0	0	0	0	11,000
018 (株)△△組		0	110,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	330,000
102 (株)△△モーター		150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	300,000
225 〇〇食堂(有)		0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	60,000
019 (有)◇◇商店		500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	1,000,000
100 △△建機(株)		250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	500,000
012 (株)システム△△		0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	2,500,000
077 (株)〇〇印刷所		0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,200,000
135 〇〇そばや		0	0	22,500	0	0	0	22,500	0	0	0	0	0	45,000
241 スーパー〇〇(株)		0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000
097 〇〇電機商会(株)		50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000
月間合計	0	18,776,100	475,000	2,034,000	475,000	0	0	2,034,000	18,776,100	475,000	0	0	0	43,045,200

現場別取引先明細書

2013年5月6日
1 / 3 ページ

工事No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/08/31

No.	取 引 先				摘 要	数量	単位	単 価	金 額
	日 付	工 種	細 目	要 素					
209	(株)○○建設								
001	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	長島 茂男	1.00	人	15,000.00	15,000
002	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	近藤 雅彦	1.00	人	15,000.00	15,000
003	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	大川 一郎	1.00	人	15,000.00	15,000
004	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	山田 太郎	1.00	人	10,000.00	10,000
005	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	労務費	吉田 栄一	1.00	人	10,000.00	10,000
006	08/01 (土)	盛土工事	場内切盛土	経費1	バックホウ車両98-01	1.00	日	15,000.00	15,000
007	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	高橋 秀樹	1.00	人	8,000.00	8,000
008	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	香川 雅彦	1.00	人	12,000.00	12,000
009	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	大隅 賢治	1.00	人	12,000.00	12,000
010	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	労務費	井上 大祐	1.00	人	15,000.00	15,000
011	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	経費1	ブルドーザ車両54-35	1.00	日	20,000.00	20,000
012	08/01 (土)	運搬設備工事	仮設道路土工	経費1	ダンプトラック車両35-69	1.00	日	30,000.00	30,000
013	08/03 (月)	盛土工事	客土積み運搬工	労務費	長島 茂男	1.00	人	15,000.00	15,000
014	08/03 (月)	盛土工事	客土積み運搬工	労務費	近藤 雅彦	1.00	人	15,000.00	15,000
015	08/03 (月)	盛土工事	客土積み運搬工	労務費	大川 一郎	1.00	人	15,000.00	15,000
016	08/03 (月)	盛土工事	客土積み運搬工	労務費	山田 太郎	1.00	人	10,000.00	10,000
017	08/03 (月)	盛土工事	客土積み運搬工	労務費	吉田 栄一	1.00	人	10,000.00	10,000
018	08/03 (月)	盛土工事	客土積み運搬工	経費1	バックホウ車両98-01	1.00	日	15,000.00	15,000
019	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷き	労務費	高橋 秀樹	1.00	人	8,000.00	8,000
020	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷き	労務費	香川 雅彦	1.00	人	12,000.00	12,000
021	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷き	労務費	井上 大祐	1.00	人	15,000.00	15,000
022	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷き	経費1	ブルドーザ車両54-35	1.00	日	20,000.00	20,000
023	08/03 (月)	運搬設備工事	仮設道路砂利敷き	経費1	バックホウ車両98-02	1.00	日	15,000.00	15,000

現場別商品一覧表

2013年5月6日
1 / 2 ページ

工事先No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/09/30

No.	取引先	摘要	数量	単位	単価	金額
209	(株)○○建設					
001		ダンプトラック車両35-69	2.00	日	30,000.00	60,000
002		バックホウ車両98-01	3.00	日	15,000.00	45,000
003		バックホウ車両98-02	1.00	日	15,000.00	15,000
004		ブルドーザー車両54-35	3.00	日	20,000.00	60,000
005		伊東 弘幸	1.00	人	15,000.00	15,000
006		伊東 四郎	1.00	人	15,000.00	15,000
007		井上 大祐	2.00	人	15,000.00	30,000
008		吉田 栄一	2.00	人	10,000.00	20,000
009		近藤 雅彦	5.00	人	15,000.00	75,000
010		香川 雅彦	2.00	人	12,000.00	24,000
011		高橋 秀樹	2.00	人	8,000.00	16,000
012		山田 太郎	2.00	人	10,000.00	20,000
013		石橋 孝明	1.00	人	15,000.00	15,000
014		大隅 賢治	1.00	人	12,000.00	12,000
015		大川 一郎	4.00	人	15,000.00	60,000
016		長島 茂男	5.00	人	15,000.00	75,000
	小計					557,000
133	(株)△△商事					
017		As舗装機械Asフィニッシャ	3.00	日	90,400.00	271,200
018		アスファルト合材	350.00	m3	8,050.00	2,817,500
019		アスファルト類AS乳剤	880.00	m3	49.00	43,120
020		ガソリン	100.00	リットル	108.00	10,800
021		カッターブレード	10.00	枚	29,900.00	299,000
022		メタルフォーム MF3015	1,170.00	枚月	126.00	147,420
023		モルタル 1:2	150.00	m3	19,000.00	2,850,000
024		塩化ビニール管	139.00	本	15,000.00	2,085,000
025		下水道資材塩ビ管滑材	100.00	Kg	860.00	86,000
026		割栗石	500.00	m3	5,300.00	2,650,000
027		軽油	520.00	リットル	70.00	36,400
028		合板足場材	18.00	枚	3,630.00	65,340
029		人孔鉄蓋勾配受型 T-20	21.00	個	53,600.00	1,125,600
030		生コンクリート 13.5N/mm2	150.00	m3	12,000.00	1,800,000
031		生コンクリート 24N/mm2	150.00	m3	13,300.00	1,995,000
032		生コンクリート18-8-40 k	350.00	m3	12,600.00	4,410,000
033		石 材クラッシャーラン 50mm以下	311.00	m3	2,000.00	622,000
034		石 材クラッシャーランC-40K	269.00	m3	2,000.00	538,000
035		石 材砂 k	986.00	m3	3,100.00	3,056,600
036		石 材土砂(購入土) *	220.00	m3	60.00	13,200
037		石 材粒調砕石 M-40 k	80.00	m3	2,450.00	196,000
038		石 材路床置換土(岩スリ) k	100.00	m ²	1,300.00	130,000
039		切込み砂利	200.00	m3	4,400.00	880,000
040		組立マンホール1号斜壁	18.00	個	24,400.00	439,200
041		組立マンホール調整リング	11.00	個	5,120.00	56,320
042		鉄筋 SD35	10.00	t	38,500.00	385,000
043		木材(板材)	150.00	m3	60,000.00	9,000,000
044		油類・燃料ガソリン *	300.00	リットル	95.00	28,500
045		油類・燃料軽油 *	500.00	リットル	63.00	31,500
	小計					36,068,700
13	(有)▽▽商店					
046		長靴	3.00	足	1,500.00	4,500
	小計					4,500
29	(株)◇◇建設					
047		目潰し砂利100mm	246.00	m3	5,300.00	1,303,800
	小計					1,303,800
3	(株)○○組					

工種別商品一覧表

2013年5月6日
1 / 2 ページ

工事先No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/09/30

No.	取引先	摘要	数量	単位	単価	金額
***	0003 機械土工(土砂)	**** 予算金額 ****				0
		**** 繰越金額 ****				0
001	209 株○○建設	バックホウ車両98-01	1.00	日	15,000.00	15,000
002	209 株○○建設	伊東 弘幸	1.00	人	15,000.00	15,000
003	209 株○○建設	伊東 四郎	1.00	人	15,000.00	15,000
004	209 株○○建設	石橋 孝明	1.00	人	15,000.00	15,000
005	133 株△△商事	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
	小計					63,500
	差引					▲63,500
	0902 盛土工事	**** 予算金額 ****				198,275,000
		**** 繰越金額 ****				0
006	209 株○○建設	バックホウ車両98-01	2.00	日	15,000.00	30,000
007	209 株○○建設	ブルドーザ車両54-35	1.00	日	20,000.00	20,000
008	209 株○○建設	吉田 栄一	2.00	人	10,000.00	20,000
009	209 株○○建設	近藤 雅彦	3.00	人	15,000.00	45,000
010	209 株○○建設	山田 太郎	2.00	人	10,000.00	20,000
011	209 株○○建設	大川 一郎	2.00	人	15,000.00	30,000
012	209 株○○建設	長島 茂男	3.00	人	15,000.00	45,000
013	133 株△△商事	As舗装機械Asフィニッシャ	3.00	日	90,400.00	271,200
014	133 株△△商事	アスファルト合材	350.00	m3	8,050.00	2,817,500
015	133 株△△商事	アスファルト類AS乳剤	880.00	m3	49.00	43,120
016	133 株△△商事	ガソリン	100.00	リットル	108.00	10,800
017	133 株△△商事	カッターブレード	10.00	枚	29,900.00	299,000
018	133 株△△商事	メタルフォーム MF3015	1,170.00	枚月	126.00	147,420
019	133 株△△商事	モルタル 1:2	150.00	m3	19,000.00	2,850,000
020	133 株△△商事	塩化ビニール管	139.00	本	15,000.00	2,085,000
021	133 株△△商事	下水道資材塩ビ管滑材	100.00	Kg	860.00	86,000
022	133 株△△商事	割栗石	500.00	m3	5,300.00	2,650,000
023	133 株△△商事	軽油	320.00	リットル	70.00	22,400
024	133 株△△商事	合板足場材	18.00	枚	3,630.00	65,340
025	133 株△△商事	人孔鉄蓋勾配受型 T-20	21.00	個	53,600.00	1,125,600
026	133 株△△商事	生コンクリート 13.5N/mm2	150.00	m3	12,000.00	1,800,000
027	133 株△△商事	生コンクリート 24N/mm2	150.00	m3	13,300.00	1,995,000
028	133 株△△商事	生コンクリート18-8-40 k	350.00	m3	12,600.00	4,410,000
029	133 株△△商事	石 材クラッシャーラン 50mm以下	311.00	m3	2,000.00	622,000
030	133 株△△商事	石 材クラッシャーランC-40K	269.00	m3	2,000.00	538,000
031	133 株△△商事	石 材砂 k	986.00	m3	3,100.00	3,056,600
032	133 株△△商事	石 材土砂(購入土) *	220.00	m3	60.00	13,200
033	133 株△△商事	石 材粒調砕石 M-40 k	80.00	m3	2,450.00	196,000
034	133 株△△商事	石 材路床置換土(岩スリ) k	100.00	m ²	1,300.00	130,000
035	133 株△△商事	切込み砂利	200.00	m3	4,400.00	880,000
036	133 株△△商事	組立マンホール1号斜壁	18.00	個	24,400.00	439,200
037	133 株△△商事	組立マンホール調整リング	11.00	個	5,120.00	56,320
038	133 株△△商事	鉄筋 SD35	10.00	t	38,500.00	385,000
039	133 株△△商事	木材(板材)	150.00	m3	60,000.00	9,000,000
040	133 株△△商事	油類・燃料ガソリン *	300.00	リットル	95.00	28,500
041	133 株△△商事	油類・燃料軽油 *	500.00	リットル	63.00	31,500
042	013 (有)▽▽商店	長靴	3.00	足	1,500.00	4,500
043	029 (株)◇◇建設	目潰し砂利100mm	123.00	m3	5,300.00	651,900
044	003 (株)○○組	作業員	6.00	人	9,000.00	54,000
	小計					36,975,100
	差引					161,299,900
	0904 運搬設備工事	**** 予算金額 ****				17,147,190
		**** 繰越金額 ****				0
045	209 株○○建設	ダンプトラック車両35-69	2.00	日	30,000.00	60,000
046	209 株○○建設	バックホウ車両98-02	1.00	日	15,000.00	15,000

細目別商品一覧表

2013年5月6日
1 / 6 ページ

工事先No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/09/30

No.	取引先	摘要	数量	単位	単価	金額
***	0003 機械土工(土砂)					
	*** 0004 ブルドーザ掘削押土	**** 予算金額 ****				0
		**** 繰越金額 ****				0
001	209 株○○建設	バックホウ車両98-01	1.00	日	15,000.00	15,000
002	209 株○○建設	伊東 弘幸	1.00	人	15,000.00	15,000
003	209 株○○建設	伊東 四郎	1.00	人	15,000.00	15,000
004	209 株○○建設	石橋 孝明	1.00	人	15,000.00	15,000
005	133 株△△商事	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
	小計					63,500
	差引					▲63,500
	0902 盛土工事					
	9002 場内切盛土	**** 予算金額 ****				9,700,000
		**** 繰越金額 ****				0
006	209 株○○建設	バックホウ車両98-01	1.00	日	15,000.00	15,000
007	209 株○○建設	吉田 栄一	1.00	人	10,000.00	10,000
008	209 株○○建設	近藤 雅彦	1.00	人	15,000.00	15,000
009	209 株○○建設	山田 太郎	1.00	人	10,000.00	10,000
010	209 株○○建設	大川 一郎	1.00	人	15,000.00	15,000
011	209 株○○建設	長島 茂男	1.00	人	15,000.00	15,000
012	133 株△△商事	As舗装機械As7インチヤ	3.00	日	90,400.00	271,200
013	133 株△△商事	アスファルト合材	350.00	m3	8,050.00	2,817,500
014	133 株△△商事	アスファルト類AS乳剤	880.00	m3	49.00	43,120
015	133 株△△商事	カッターブレード	10.00	枚	29,900.00	299,000
016	133 株△△商事	塩化ビニール管	139.00	本	15,000.00	2,085,000

原 区 別 商 品 一 覧 表

2013年5月6日
1 / 8 ページ

工事先No. 19981201

工事名 ○○盛土及び土留め擁壁工事

対象期間1998/08/01～1998/09/30

No.	取 引 先	摘 要	数量	単位	単 価	金 額
***	0003 機械土工(土砂)					
	*** 0004 ブルドーザ掘削押土	**** 予算金額 ****				0
		**** 繰越金額 ****				0
	20 労務費					
001	209 (株)○○建設	伊東 弘幸	1.00	人	15,000.00	15,000
002	209 (株)○○建設	伊東 四郎	1.00	人	15,000.00	15,000
003	209 (株)○○建設	石橋 孝明	1.00	人	15,000.00	15,000
					計	45,000
	40 経費1					
004	209 (株)○○建設	バックホウ車両98-01	1.00	日	15,000.00	15,000
005	133 (株)△△商事	軽油	50.00	リットル	70.00	3,500
					計	18,500
	小 計					63,500
	差 引					▲63,500
	0902 盛土工事					
	9002 場内切盛土	**** 予算金額 ****				9,700,000
		**** 繰越金額 ****				0
	10 材料費					
006	133 (株)△△商事	As舗装機械Asフイニッヤ	3.00	日	90,400.00	271,200
007	133 (株)△△商事	アスファルト合材	350.00	m3	8,050.00	2,817,500
008	133 (株)△△商事	アスファルト類AS乳剤	880.00	m3	49.00	43,120
009	133 (株)△△商事	カッターブレード	10.00	枚	29,900.00	299,000
010	133 (株)△△商事	塩化ビニール管	139.00	本	15,000.00	2,085,000
011	133 (株)△△商事	下水道資材塩ビ管滑材	100.00	Kg	860.00	86,000

気象・海象月報

2013年5月6日
1 / 1 ページ

平成 10 年 5 月

工事名 ○○湾災害復旧工事

請負者 株式会社○○建設

日時	天候	温度		9 時				15 時				台風・低気圧の状況 その他の記事
		最高	最低	風向	風速	気圧	波高	風向	風速	気圧	波高	
1	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
2	曇	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
3		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	
4		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	
5		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	
6	雨	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
7	晴／曇	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
8	晴／雨	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
9	曇／晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
10		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	
11	曇／雨	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
12	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
13	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
14	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
15	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
16	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
17		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	
18	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
19	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
20	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
21	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
22	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
23	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
24		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	
25	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
26	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
27	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
28	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
29	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	
30	晴	25.0℃	15.0℃	N	5.0m	1010hpa	2.0m	NE	5.0m	1010hpa	2.0m	テスト
31		℃	℃		m	hpa	m		m	hpa	m	

- (注) 1. 天候は、就業時間内の観測結果を記入する事。
2. 風速の測定は、風速計によるものとし、これによらない場合は海上用風級から求めた風速(この場合備考に付記する事)を記入する事。

工事分析報告書


発行日 2013/05/06
1 / 1 ページ

5月分


締め日 2013/05/06

工事名 □□工事


工事分析表

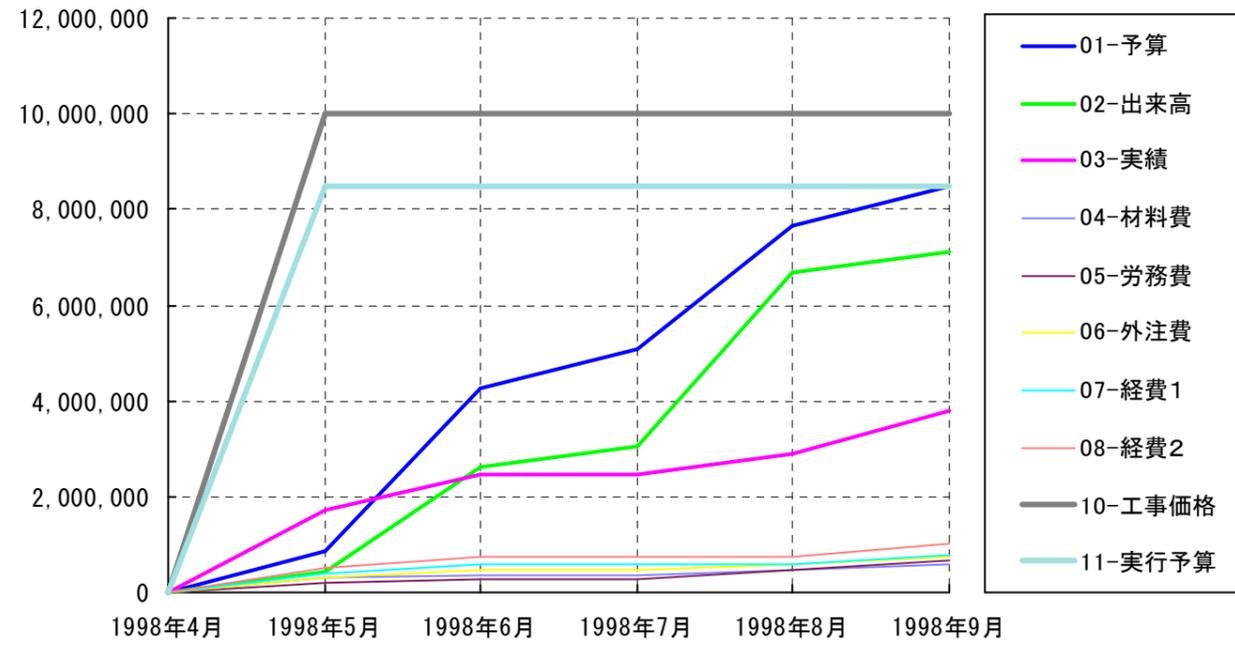


予算費目内訳表

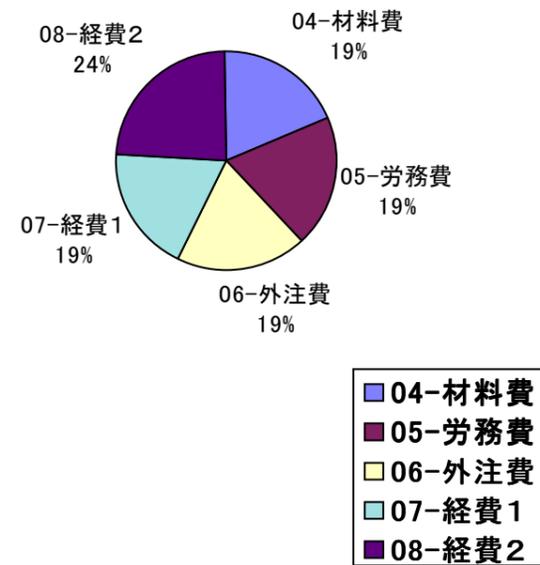


実績費目内訳表

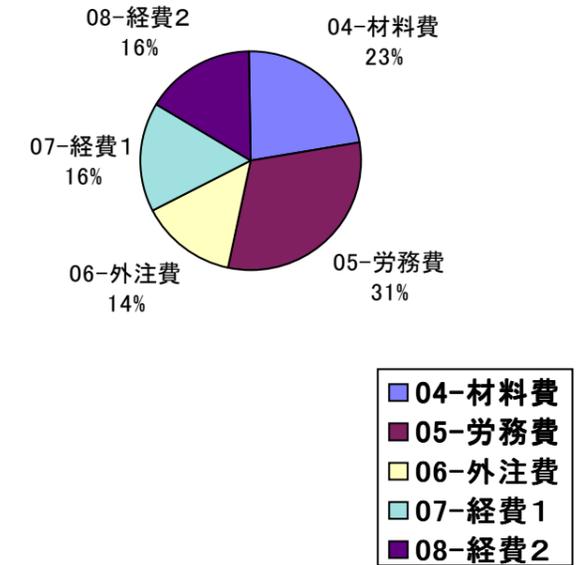

予実績分析表

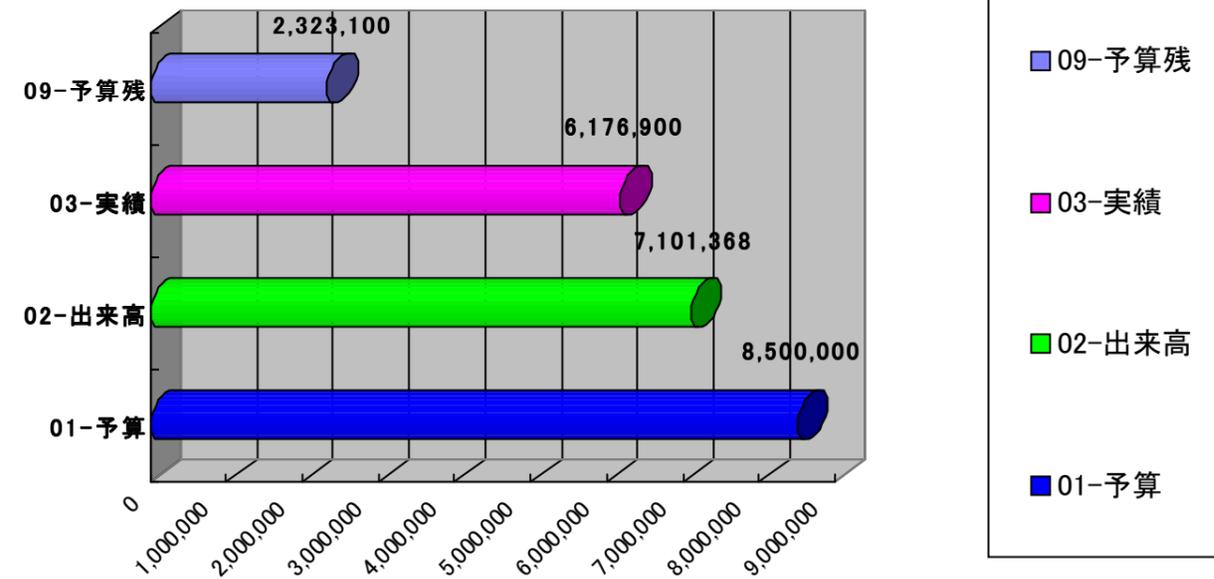

工種分析表

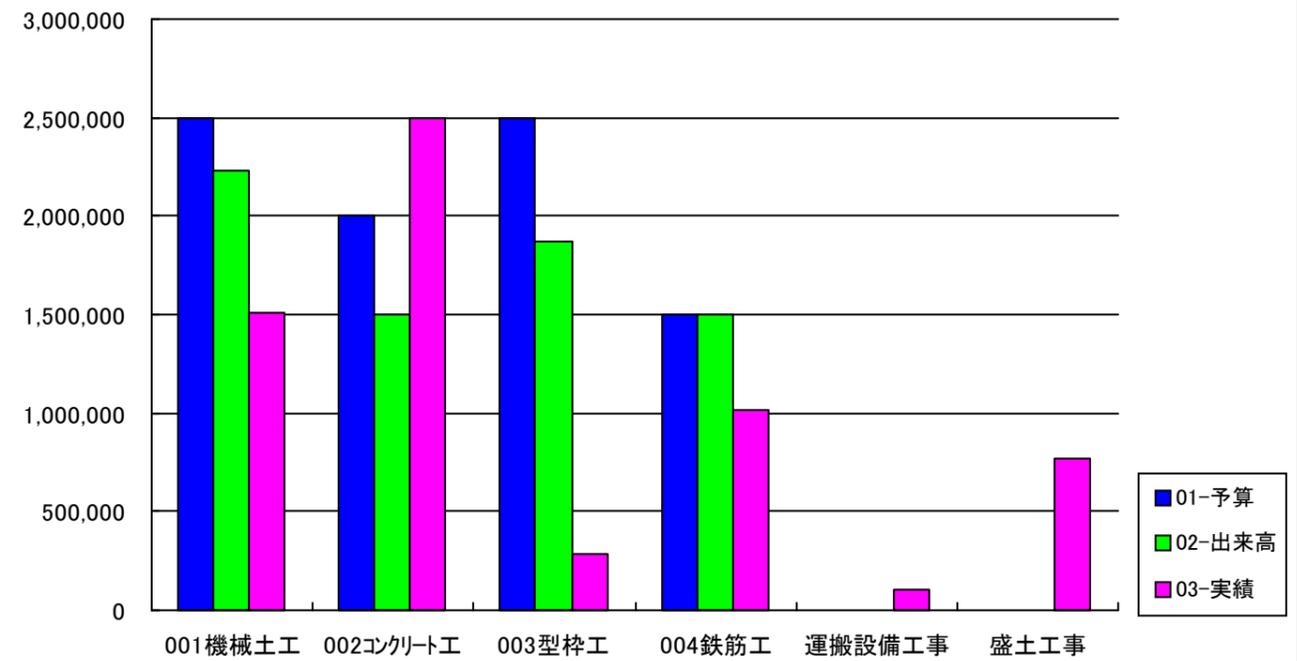

発注者一覧表

2013年5月6日
1 / 1 ページ

No.	発注者	No.	発注者	No.	発注者	No.	発注者
0001	〇〇建設	0073	山形村				
0002	東京都	0074	気仙郡*****				
0003	宮城県	0075	三陸町				
0004	岩手県	0076	住田町				
0006	千葉県	0077	下閉伊郡*****				
0026	盛岡市	0078	岩泉町				
0027	一関市	0079	川井村				
0028	江刺市	0080	田野畑村				
0029	大船渡市	0081	田老町				
0030	釜石市	0082	新里村				
0031	北上市	0083	普代村				
0032	久慈市	0084	山田町				
0033	遠野市	0085	紫波郡*****				
0034	二戸市	0086	紫波町				
0035	花巻市	0087	矢巾町				
0036	水沢市	0088	西磐井群*****				
0037	宮古市	0089	花泉町				
0038	陸前高田市	0090	平泉町				
0051	胆沢郡*****	0091	二戸郡*****				
0052	胆沢町	0092	安代町				
0053	金ヶ崎町	0093	一戸町				
0054	衣川村	0094	浄法寺町				
0055	前沢町	0095	稗貫郡*****				
0056	岩手郡*****	0096	石鳥谷町				
0057	岩手町	0097	大迫町				
0058	葛巻町	0098	東磐井郡*****				
0059	雫石町	0099	川崎村				
0060	滝沢村	0100	千厩町				
0061	玉山村	0101	大東町				
0062	西根村	0102	東山町				
0063	松尾村	0103	藤沢町				
0064	上閉伊郡*****	0104	室根村				
0065	大槌町	0105	和賀郡*****				
0066	宮守村	0106	沢内村				
0067	九戸郡*****	0107	東和町				
0068	大野村	0108	湯田町				
0069	軽米町						
0070	九戸村						
0071	種市町						
0072	野田村						

取引先一覧表

2013年5月6日
1 / 6 ページ

No.	取引先名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号	担当者	締日	備考欄
209	(株)〇〇建設	〒131-0045	〇〇都〇〇区押上3-7-4	(03)-0011-1111	(03)-0011-1112		31	
133	(株)△△商事	〒151-0064	〇〇都〇〇区〇〇107	(03)-1502-2220	(03)-1502-2221			
251	〇〇塗装工業(株)							
014	凸凹工場	〒142-0051	〇〇都〇〇区〇〇33-598	(03)-1589-6696	(03)-1589-6696		20	
238	〇〇塗装工業(株)	〒206-0822	〇〇都〇〇市〇〇41-85	(03)-2574-0199	(03)-2574-0199			
211	(株)〇〇舗装	〒173-0004	〇〇都〇〇区〇〇10-8	(03)-1498-8852	(03)-1498-8853			
245	(株)〇〇印刷所	〒198-0003	〇〇都〇〇市〇〇63-854	(03)-2255-5551	(03)-2255-5552			
204	〇〇産業(株)〇〇支店	〒162-0817	〇〇都〇〇区〇〇町8-10-9	(03)-0146-6255	(03)-0146-6256			
101	(株)△△建設	〒203-0012	〇〇都〇〇市〇〇町8-8-9	(03)-5669-9997	(03)-5669-9998			
154	〇〇建設(株)	〒130-0014	〇〇都〇〇区〇〇3-1-4	(03)-3350-0001	(03)-3350-0002			
036	(株)〇〇クレーン	〒174-0075	〇〇都〇〇区〇〇				31	
137	〇〇鉄工所株式会社	〒174-0051	〇〇都〇〇区〇〇4-8-7	(03)-5940-0159	(03)-5940-0160			
151	〇〇ブロック(株)	〒175-0093	〇〇都〇〇区〇〇町52-5	(03)-5240-0140	(03)-5140-0141			
153	(株)〇〇工業	〒140-0012	〇〇都〇〇区〇〇5-5-5	(03)-9360-0145	(03)-9360-0146			
092	(有)〇〇運送	〒180-0001	〇〇都〇〇市〇〇町10-5	(03)-4113-3325	(03)-4113-3326			
236	有限会社〇〇重機	〒186-0014	〇〇都〇〇市〇〇3-85-74	(03)-4419-9657	(03)-4419-9658			
013	(有)▽▽商店	〒206-0801	〇〇都〇〇市〇〇1-1-10	(03)-3969-5874	(03)-3969-5875		31	
029	(株)◇◇建設	〒116-0002	〇〇都〇〇区〇〇4-8-9	(03)-8025-5567	(03)-8025-5567		31	
003	(株)〇〇組	〒175-0093	〇〇都〇〇区〇〇町225-303	(03)-256-5533	(03)-256-5533		31	
205	(株)〇〇産業	〒120-0005	〇〇都〇〇区〇〇10-86	(03)-5930-0259	(03)-5930-0260			
015	〇〇鉄工所(株)	〒121-0803	〇〇都〇〇区〇〇33-96	(03)-5922-2569	(03)-5922-2569		31	
198	〇〇火薬店(株)	〒206-0033	〇〇都〇〇市〇〇3-7-8	(03)-2576-5595	(03)-2576-5596			
132	〇〇商店	〒116-0013	〇〇都〇〇区〇〇7-8-1	(03)-7801-1010	(03)-4701-1011			
006	(株)〇〇商店	〒121-0836	〇〇都〇〇区〇〇33	(03)-585-6698	(03)-585-6699		31	
243	〇〇建塗工業(株)	〒206-0803	〇〇都〇〇市〇〇14-8	(03)-5001-1140	(03)-5001-1141			
129	(有)◇◇無線	〒150-0032	〇〇都〇〇区〇〇町52-5	(03)-5777-0014	(03)-5777-0015			
062	(有)〇〇商店	〒206-0811	〇〇都〇〇市〇〇					
074	(有)〇〇鋳業所	〒185-0036	〇〇都〇〇市〇〇町95-5	(03)-5661-1235	(03)-5661-1236			
090	(有)〇〇本店	〒170-0004	〇〇都豊島区北大塚9-9-15	(03)-9951-1148	(03)-9951-1149			
250	(株)〇〇工業	〒206-0035	〇〇都多摩市唐木田1-1-1	(03)-7990-0298	(03)-7990-0299			
023	(株)〇〇写真	〒181-0014	〇〇都三鷹市野崎9-9-9	(03)-9975-5569	(03)-9975-5569		31	
235	〇〇金属工業(株)	〒150-0042	〇〇都渋谷区宇田川町85-7	(03)-5744-4598	(03)-5744-4599			
021	〇〇金物店(有)	〒125-0053	〇〇都葛飾区鎌倉77-598	(03)-5558-9874	(03)-5558-9874		31	
039	〇〇商事(株)〇〇営業所	〒143-0011	〇〇都大田区大森本町9-8-7				31	
063	〇〇機械(株)〇〇営業所	〒132-0022	〇〇都江戸川区大杉5-10	(03)-1125-3366	(03)-1125-3367			
076	(有)〇〇企画	〒140-0012	〇〇都〇〇区勝島14587	(03)-4545-2659	(03)-4545-2660			
160	〇〇钣金工業所(株)	〒187-0043	〇〇都小平市学園東町2-57	(03)-8253-0256	(03)-8253-0257			
018	(株)△△組	〒133-0054	〇〇都江戸川区上篠崎44-529	(03)-3636-2541	(03)-3636-2542		31	
047	(株)〇〇商会	〒116-0002	〇〇都〇〇区〇〇222	(03)-6555-2325	(03)-6555-2325			

社員名簿一覽表

2013年5月6日
1 / 3 ページ

ID	コード	氏名	区分	性別	血液	保険番号	生年月日	年齢	入社日	勤続	部署名	役職	郵便番号	住所	電話番号
048	000050	石橋 孝明		男性	A型	全国土建△△△	1941/06/05	71	1991/12/10	21	工務部工事課	普通作業員	〒125-0052	東京都葛飾区柴又1-4-9	(03)-3332-2581
078	000065	伊東 四郎	臨時	男性	O型		1962/04/05	51	1998/01/26	15	工務部工事課	特殊作業員	〒186-0011	東京都国立市谷保7-9-2	(03)-3877-7400
051	000053	伊東 弘幸		男性	O型	全国土建△△△	1949/04/15	64	1993/01/25	20	工務部工事課	普通作業員	〒170-0011	東京都豊島区池袋本町5-5-5	(03)-3366-6658
013	000013	井上 大祐		男性	B型	全国土建△△△	1958/03/04	55	1976/04/01	37	工務部	普通作業員	〒185-0013	東京都国分寺市西恋ヶ窪1-1-1	(03)-6290-0268
017	000017	上島 幸則		男性	A型	全国土建△△△	1959/12/08	53	1978/03/22	35	工務部工務課	普通作業員	〒184-0014	東京都小金井市貫井南町15-8	(03)-2699-4762
021	000024	内村 春男	担当	男性	O型	全国土建△△△	1971/02/18	42	1989/04/01	24	工務部工務課	世話役人	〒165-0022	東京都中野区江古田159	(03)-6039-7444
034	000035	浦島 太郎		男性	O型	全国土建△△△	1944/01/15	69	1979/01/29	34	工務部工事課	普通作業員	〒186-0003	東京都国立市富士見台5-8-7	(03)-9114-4565
040	000041	江川 伸彦		男性	B型	全国土建△△△	1938/10/29	74	1982/04/01	31	工務部工事課	普通作業員	〒153-0042	東京都目黒区青葉台1-7-8	(03)-1000-1475
053	000055	遠藤 雅之	担当	男性	A型	全国土建△△△	1957/10/20	55	1994/01/05	19	工務部工事課	世話役人	〒181-0016	東京都三鷹市深大寺5897	(03)-1152-9965
003	000003	大川 一郎	外注	男性	A型	全国土建△△△	1956/10/26	56	1979/04/01	34	営業部	特殊作業員	〒121-0803	東京都足立区伊興町白幡15-8-8	(03)-8105-5298
012	000012	大隅 賢治		男性	A型	全国土建△△△	1965/02/24	48	1997/04/01	16	営業部営業課	普通作業員	〒142-0061	東京都品川区小山台10-5 大政マンション 14-502	(03)-8896-2066
056	000061	大曾根 秀樹		男性	O型	全国土建△△△	1957/01/29	56	1996/05/27	16	工務部工事課	普通作業員	〒120-0001	東京都足立区大谷田7-1-10	(03)-5525-2220
032	000033	近江 俊彦		男性	O型	全国土建△△△	1936/12/27	76	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	〒173-0035	東京都板橋区大谷口1-1-4	(03)-8099-7487
039	000040	大森 俊夫		男性	B型	全国土建△△△	1958/12/30	54	1978/03/22	35	工務部工事課	普通作業員	〒198-0041	東京都青梅市勝沼3-8-7	(03)-2299-8588
036	000037	岡野 宗男	外注	男性	B型	全国土建△△△	1956/02/28	57	1981/03/21	32	工務部工事課	特殊作業員	〒180-0001	東京都武蔵野市吉祥寺北町6-6-6	(03)-3342-4250
058	000063	沖野 忠志		男性	A型	全国土建△△△	1971/12/04	41	1996/12/16	16	工務部工事課	普通作業員	〒194-0211	東京都町田市相原町33-85	(03)-1414-2852
011	000011	香川 雅彦		男性	O型	全国土建△△△	1959/07/28	53	1982/03/29	31	営業部営業課	普通作業員	〒100-2211	東京都小笠原諸島小笠原村母島4-8-7	(03)-4998-8857
064	000074	片桐 悟	臨時	男性	A型	船員保険△△△	1946/09/07	66	1987/04/21	26	工務部工事課	特殊作業員	〒170-0011	東京都豊島区池袋本町85	(03)-5299-9995
026	000030	川口 弘		男性	A型	全国土建△△△	1979/01/25	34	1997/04/01	16	工務部工務課	普通作業員	〒162-0062	東京都新宿区市谷加賀町105	(03)-5975-1001
020	000021	川島 五郎	担当	男性	A型	全国土建△△△	1944/10/04	68	1990/08/27	22	工務部工務課	世話役人	〒110-0002	東京都台東区上野桜木8-8-8	(03)-6002-2002
023	000027	北島 良夫		男性	AB型	全国土建△△△	1976/02/02	37	1994/10/01	18	工務部工務課	普通作業員	〒184-0002	東京都小金井市梶野町65-858	(03)-2717-9608
067	000077	木下 啓介		男性	A型	船員保険△△△	1950/11/15	62	1993/07/01	19	工務部工事課	普通作業員	〒115-0055	東京都北区赤羽西528-748	(03)-5666-9588
019	000020	清原 則夫	担当	男性	O型	全国土建△△△	1960/10/25	52	1981/05/21	31	工務部工務課	世話役人	〒154-0001	東京都世田谷区池尻14-85	(03)-5749-6620
057	000062	久保 正勝		男性	B型	全国土建△△△	1966/11/29	46	1996/10/01	16	工務部工事課	普通作業員	〒112-0002	東京都文京区小石川6-6-8	(03)-9987-7458
080	000082	久米 寛	臨時	男性	A型		1962/12/20	50	1997/12/01	15		特殊作業員	〒204-0002	東京都清瀬市旭が丘4-9-66	(03)-3350-0025
055	000060	小室 均	無効	男性	O型	全国土建△△△	1967/01/08	46	1996/03/11	17	工務部工事課	特殊作業員	〒202-0011	東京都保谷市泉町8-8-8	(03)-7744-4458
002	000002	近藤 雅彦	担当	男性	A型	全国土建△△△	2026/03/03	-13	1986/01/06	27	総務部	世話役人	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢1-1-1	(03)-2525-9865
073	000078	今野 知之		男性	AB型	全国土建△△△	1950/02/04	63	1989/01/16	24	工務部工事課	普通作業員	〒143-0014	東京都大田区大森中5-6-85	(03)-3300-0254
031	000032	西城 克典		男性	A型	全国土建△△△	1933/12/08	79	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	〒133-0041	東京都江戸川区上一色7-7-58	(03)-4900-2269
070	000072	坂本 竜一		男性	O型	全国土建△△△	1950/04/24	63	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	〒114-0031	東京都北区十条仲原5-5-70	(03)-0225-1400
024	000028	定岡 稔		男性	O型	全国土建△△△	1978/09/06	34	1997/04/01	16	工務部工務課	普通作業員	〒206-0042	東京都多摩市山王下75-36	(03)-9622-5199
035	000036	沢田 義幸		男性	A型	全国土建△△△	1946/03/19	67	1983/09/29	29	工務部工事課	普通作業員	〒116-0002	東京都荒川区荒川49-87	(03)-0015-2000
069	000073	清水 健児		男性	O型	全国土建△△△	1940/07/07	72	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	〒184-0002	東京都小金井市梶野町4-8-1	(03)-5777-8590
076	000081	庄司 雅浩		男性	A型	全国土建△△△	1936/07/15	76	1994/06/01	18	工務部工事課	普通作業員	〒190-0012	東京都立川市曙町2-3-4	(03)-3002-5205
030	000031	杉田 二郎		男性	AB型	全国土建△△△	1934/01/27	79	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	〒196-0011	東京都昭島市上川原町5-5-9	(03)-7952-6588
059	000066	杉山 和尚		男性	B型	全国土建△△△	1944/09/24	68	1975/09/08	37	工務部工事課	普通作業員	〒178-0061	東京都練馬区大泉学園町2-928	(03)-8699-9555
014	000014	鈴木 健亮		男性	O型	全国土建△△△	1957/11/17	55	1976/04/01	37	工務部工務課	普通作業員	〒201-0005	東京都狛江市市岩戸南47-505 ひばりが丘	(03)-4785-5551
018	000018	鈴木 宏明	担当	男性	B型	全国土建△△△	1947/10/12	65	1982/04/01	31	工務部工務課	世話役人	〒100-0601	東京都神津島神津島村神津島村一円99	(03)-3251-1092
044	000045	関根 務		男性	B型	全国土建△△△	1955/07/26	57	1990/01/08	23	工務部工事課	普通作業員	〒206-0812	東京都稲城市矢野口7-7-52	(03)-3369-9995

社員単価一覧表

2013年5月6日
1 / 3 ページ

ID	コード	氏名	区分	性別	血液	保険番号	生年月日	年齢	入社日	勤続	部署名	役職	基本単価	補正率	単価	備考欄
048	000050	石橋 孝明		男性	A型	全国土建△△△	1941/06/05	71	1991/12/10	21	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	15,000	
078	000065	伊東 四郎	臨時	男性	O型		1962/04/05	51	1998/01/26	15	工務部工事課	特殊作業員	0	0.00	15,000	
051	000053	伊東 弘幸		男性	O型	全国土建△△△	1949/04/15	64	1993/01/25	20	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	15,000	
013	000013	井上 大祐		男性	B型	全国土建△△△	1958/03/04	55	1976/04/01	37	工務部	普通作業員	0	0.00	15,000	
017	000017	上島 幸則		男性	A型	全国土建△△△	1959/12/08	53	1978/03/22	35	工務部工務課	普通作業員	0	0.00	15,000	
021	000024	内村 春男	担当	男性	O型	全国土建△△△	1971/02/18	42	1989/04/01	24	工務部工務課	世話役人	0	0.00	15,000	
034	000035	浦島 太郎		男性	O型	全国土建△△△	1944/01/15	69	1979/01/29	34	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	10,000	
040	000041	江川 伸彦		男性	B型	全国土建△△△	1938/10/29	74	1982/04/01	31	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	5,000	
053	000055	遠藤 雅之	担当	男性	A型	全国土建△△△	1957/10/20	55	1994/01/05	19	工務部工事課	世話役人	0	0.00	10,000	
003	000003	大川 一郎	外注	男性	A型	全国土建△△△	1956/10/26	56	1979/04/01	34	営業部	特殊作業員	0	0.00	15,000	
012	000012	大隅 賢治		男性	A型	全国土建△△△	1965/02/24	48	1997/04/01	16	営業部営業課	普通作業員	0	0.00	12,000	
056	000061	大曾根 秀樹		男性	O型	全国土建△△△	1957/01/29	56	1996/05/27	16	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	10,000	
032	000033	近江 俊彦		男性	O型	全国土建△△△	1936/12/27	76	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	12,000	
039	000040	大森 俊夫		男性	B型	全国土建△△△	1958/12/30	54	1978/03/22	35	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	12,000	
036	000037	岡野 宗男	外注	男性	B型	全国土建△△△	1956/02/28	57	1981/03/21	32	工務部工事課	特殊作業員	0	0.00	5,000	
058	000063	沖野 忠志		男性	A型	全国土建△△△	1971/12/04	41	1996/12/16	16	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	12,000	
011	000011	香川 雅彦		男性	O型	全国土建△△△	1959/07/28	53	1982/03/29	31	営業部営業課	普通作業員	0	0.00	12,000	
064	000074	片桐 悟	臨時	男性	A型	船員保険△△△	1946/09/07	66	1987/04/21	26	工務部工事課	特殊作業員	0	0.00	10,000	
026	000030	川口 弘		男性	A型	全国土建△△△	1979/01/25	34	1997/04/01	16	工務部工務課	普通作業員	0	0.00	10,000	
020	000021	川島 五郎	担当	男性	A型	全国土建△△△	1944/10/04	68	1990/08/27	22	工務部工務課	世話役人	0	0.00	11,000	
023	000027	北島 良夫		男性	AB型	全国土建△△△	1976/02/02	37	1994/10/01	18	工務部工務課	普通作業員	0	0.00	10,000	
067	000077	木下 啓介		男性	A型	船員保険△△△	1950/11/15	62	1993/07/01	19	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	12,000	
019	000020	清原 則夫	担当	男性	O型	全国土建△△△	1960/10/25	52	1981/05/21	31	工務部工務課	世話役人	0	0.00	7,000	
057	000062	久保 正勝		男性	B型	全国土建△△△	1966/11/29	46	1996/10/01	16	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	10,000	
080	000082	久米 寛	臨時	男性	A型		1962/12/20	50	1997/12/01	15		特殊作業員	0	0.00	10,000	
055	000060	小室 均	無効	男性	O型	全国土建△△△	1967/01/08	46	1996/03/11	17	工務部工事課	特殊作業員	0	0.00	8,000	
002	000002	近藤 雅彦	担当	男性	A型	全国土建△△△	2026/03/03	-13	1986/01/06	27	総務部	世話役人	0	0.00	15,000	
073	000078	今野 知之		男性	AB型	全国土建△△△	1950/02/04	63	1989/01/16	24	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	9,000	
031	000032	西城 克典		男性	A型	全国土建△△△	1933/12/08	79	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	15,000	
070	000072	坂本 竜一		男性	O型	全国土建△△△	1950/04/24	63	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	8,000	
024	000028	定岡 稔		男性	O型	全国土建△△△	1978/09/06	34	1997/04/01	16	工務部工務課	普通作業員	0	0.00	12,000	
035	000036	沢田 義幸		男性	A型	全国土建△△△	1946/03/19	67	1983/09/29	29	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	5,000	
069	000073	清水 健児		男性	O型	全国土建△△△	1940/07/07	72	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	8,000	
076	000081	庄司 雅浩		男性	A型	全国土建△△△	1936/07/15	76	1994/06/01	18	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	10,000	
030	000031	杉田 二郎		男性	AB型	全国土建△△△	1934/01/27	79	1969/07/01	43	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	15,000	
059	000066	杉山 和尚		男性	B型	全国土建△△△	1944/09/24	68	1975/09/08	37	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	12,000	
014	000014	鈴木 健亮		男性	O型	全国土建△△△	1957/11/17	55	1976/04/01	37	工務部工務課	普通作業員	0	0.00	10,000	
018	000018	鈴木 宏明	担当	男性	B型	全国土建△△△	1947/10/12	65	1982/04/01	31	工務部工務課	世話役人	0	0.00	7,000	
044	000045	関根 務		男性	B型	全国土建△△△	1955/07/26	57	1990/01/08	23	工務部工事課	普通作業員	0	0.00	12,000	

工種マスター一覧表

2013年5月6日
1 / 4 ページ

No.	工種	No.	工種	No.	工種
0003	機械土工(土砂)	0076	トンネル内装板設置	0137	浚渫工
0005	安定処理工	0081	路面切削工	0138	柔構造通門通管
0006	小規模土工	0082	道路打換工	0143	堤防除草工
0008	準備・調査・試験その他工事	0083	アスファルト注入工	0144	堤防天端補修工
0011	人力土工	0084	床版補強工	0145	堤防芝養生工
0016	機械土工(岩石)	0085	道路除草工	0146	伐木除根工
0021	構造物取り壊し	0086	道路清掃工	0147	塵芥処理
0022	取り壊し殻	0087	目地補修工	0148	ボーリンググラウト工
0023	吹付法面取壊し	0088	トンネル漏水対策工	0153	杭打工
0024	はつり工	0089	路上再生路盤工	0154	場所打杭工
0029	排水構造物一連	0090	路盤再生路盤工	0155	深礎工
0030	排水構造物	0091	舗装版破碎工	0156	オープンケーソン工
0031	基礎・裏込捨石工	0092	橋梁補修工	0157	ニューマチックケーソン工
0036	コンクリート工	0093	わだち漏れ補修	0162	土工
0037	型枠工	0094	除雪	0168	集水井工
0038	鉄筋工	0099	軟弱地盤処理工	0169	集排水ボーリング工
0039	基礎・裏込砕石工	0100	高圧噴射攪拌工	0170	水路工
0044	路盤工	0101	薬液注入工	0172	集排水ボーリング孔洗浄工
0049	アスファルト舗装工	0102	アンカー工	0173	落石防護柵設置工
0050	グースアスファルト舗装工	0104	旧橋撤去工	0178	矢板工
0051	半たわみ性舗装工	0105	かご工	0179	仮設工
0053	薄層カラー舗装工	0106	緑化ブロック積工	0180	仮橋・仮浅橋工
0054	コンクリート舗装工	0107	コンクリート矢板工	0181	切土及び発破防護柵工
0055	ローラ転圧コンクリート舗装工	0108	目地材設置	0182	土のう積工
0060	ガードケーブル設置	0109	その他	0183	仮設材損料
0061	防護柵設置工(機械打込)	0114	擁壁工	0188	共同溝工
0062	防護柵設置工(人力建込)	0115	連続中壁工	0189	キャブ工・土工・基礎
0063	歩道用ガードパイプ設置工	0116	多自然型護岸工	0190	キャブ工・本体工
0064	落石防護設置工	0117	かごマット工	0191	電線共同溝工
0065	落石防止網設置工	0122	盛土法面整形	0196	仮設材等運搬
0066	防雪柵設置工	0123	切土法面整形	0197	重機運搬
0067	ガードレール設置	0124	種子帯工・芝張工	0198	重機運搬自走式
0068	路側工	0125	現場吹付法枠	0199	重機分解
0069	組立歩道工	0126	既製法枠	0200	重機分解組立運搬
0070	道路植栽工	0127	現場打法枠	0205	公園植栽工
0071	道路付属物工	0128	法枠中詰	0210	橋面防水工
0072	特殊ブロック設置工	0129	吹付工	0211	鋼製橋脚設置工
0073	しゃ音壁設置工	0134	消波根固ブロック工	0212	架設支保工
0074	洞門工	0135	捨石工	0213	橋梁排水管設置工
0075	区画線工	0136	海上消波工	0214	歩道橋架設工

細目マスター一覧表

2013年5月6日
1 / 13 ページ

No.	細目	単位
006	小規模土工	
0051	タンパ締固め	
008	準備・調査・試験その他工事	
9519	品質管理	式
9520	測量工	式
9534	*	式
011	人土工	
0057	人力切り崩し	m2
0058	人力掘削(床堀)	
0059	人力積込み	
0060	人力盛土(埋め戻し)	
016	機械土工(岩石)	
0066	リッパ掘削オープンカット	
0067	火薬併用リッパ掘削	
0068	大型ブレーカ掘削	
0069	大型ブレーカ床堀	
0070	人力 機械掘削 片切	
0071	火薬 機械掘削 片切	
0072	人力 掘削 片切	
0073	大型ブレーカ転石破碎	
0074	火薬転石破碎	
021	構造物取り壊し	
0080	大型ブレーカ取壊し	
0081	コンクリートブレーカ取壊し	
0082	コンクリート圧碎機取壊し	
0083	コンクリート破碎機取壊し	
0084	ダイナマイト取壊し	
022	取り壊し殻	
0089	取壊し殻 集積・積込・運搬	
0090	取壊し殻 集積・積込	
0091	取壊し殻 運搬	
023	吹付法面取壊し	
0096	吹付法面取壊し(複合)	
0097	吹付法面取壊し	
0098	吹付法面取壊し 集積積込	
0099	吹付法面取壊し 運搬	
024	はつり工	
0104	はつり工	
029	排水構造物一連	
0110	U形側溝据付 L=600mm	

No.	細目	単位
0111	U形側溝据付 L=1000mm	本
0112	U形側溝据付 L=2000mm	
0113	L形側溝据付 L=600mm	
0114	ヒューム管A型管(カラー管)据付	
0115	ヒューム管B型管(ソケット管)据付	
0116	ボックスカルバート据付 L=1000	
0117	ボックスカルバート据付 L=1500	
0118	ボックスカルバート据付 L=2000	
0119	ボックスカルバート据付縦縮L1500mm	
0120	ボックスカルバート据付縦縮L2000mm	
0121	自由勾配側溝据付	
0122	暗渠排水管据付(直管)	
0123	暗渠配水管据付(波状管・網状管)	
0124	管(函)渠型側溝据付	
0125	集水桝据付	
0126	マンホール据付	
030	排水構造物	
0131	U形側溝据付 L=600mm	
0132	U形側溝据付 L=1000mm	
0133	U形側溝据付 L=2000mm	
0134	L形側溝据付 L=600mm	
0135	ヒューム管A形管(カラー管)据付	
0136	ヒューム管B形管(ソケット管)据付	
0137	ボックスカルバート据付 L=1000	
0138	ボックスカルバート据付 L=1500	
0139	ボックスカルバート据付 L=2000	
0140	ボックスカルバート据付縦縮L1500mm	
0141	ボックスカルバート据付縦縮L2000mm	
0142	蓋版据付	
0143	自由勾配側溝据付	
0144	暗渠排水管据付(直管)	
0145	暗渠排水管据付(波状管・網状管)	
0146	管(函)渠型側溝据付	
0147	集水桝据付	
0148	マンホール据付	
0149	フィルタ材据付	
031	基礎・裏込捨石工	
0154	基礎砕石工	
0155	裏込砕石工	
0156	基礎栗石工	

No.	細目	単位
0157	裏込栗石工	
036	コンクリート工	
0163	帆布敷設	m3
0164	ポンプ車打設(橋梁床版)	
0165	クレーン車打設	m3
0166	人力打設	
0167	一般養生	m3
0168	練炭養生	
0169	ジェットヒータ養生	m3
0170	モルタル練工	
9052	コンクリート工	式
037	型枠工	
0175	無筋・鉄筋構造物 型枠	
0176	小型構造物(1) 型枠	
0177	小型構造物(2) 型枠	
0178	合板円形	
0179	均し基礎コンクリート 型枠	
0180	化粧型枠	
9053	型枠工	式
038	鉄筋工	
0185	鉄筋加工	
0186	鉄筋組立	
0187	鉄筋 加工・組立	
0188	ガス溶接	
0189	太径 鉄筋加工	
0190	太径 鉄筋組立	
0191	太径 鉄筋 加工・組立	
0192	太径 ガス圧接	
0193	差 筋	
9054	鉄筋工	式
039	基礎・裏込砕石工	
0198	基礎砕石工	
0199	裏込砕石工	
0200	基礎栗石工	
0201	裏込栗石工	
044	路盤工	
0207	不陸整正	
0208	路盤工(上層・下層)	
0209	人力路盤工(歩道・路肩部)	
0210	人力路盤工(車道)	

商品単価一覧表

2013年5月6日
1 / 2 ページ

取引先No. 133

取引先名 (株)△△商事

No.	品 名 ・ 規 格	単 位	単 価	備 考
001	As舗装機械Asフィニッシャ	日	90,400.00	
002	Lピン	本	286.00	
003	PコンD型	個	59.00	
004	Uクリップ	個	19.00	
005	アスファルト合材	m3	8,050.00	
006	アスファルト混合剤	t	7,800.00	
007	アスファルト類AS乳剤	m3	49.00	
008	ガソリン	リットル	108.00	
009	カッターブレード	枚	29,900.00	
010	ジャッキベースA15	個月	59.00	
011	セパレータD型L=300	本	61.00	
012	セメント普通ポルトランド	t	17,600.00	
013	なまし鉄線#8	kg	83.00	
014	フォームタイD型	本	108.00	
015	フューム管	本	4,000.00	
016	メタルフォーム	m3	13,300.00	
017	メタルフォーム MF3006	枚月	115.00	
018	メタルフォーム MF3015	枚月	126.00	
019	モルタル 1:2	m3	19,000.00	
020	塩化ビニール管	本	15,000.00	
021	下水道資材塩ビ管滑材	Kg	860.00	
022	下水道資材接着剤	Kg	1,420.00	
023	下水道資材番線	m	33.00	
024	下水道用塩ビ継手	個	2,110.00	
025	割栗石	m3	5,300.00	
026	筋違A14	本月	41.00	
027	軽油	リットル	70.00	
028	合板足場材	枚	3,630.00	
029	座金3型	個	60.00	
030	樹脂製桝・塩ビ製マンホール	個	25,900.00	
031	集水桝・汚水桝排水桝	個	7,420.00	
032	人孔鉄蓋勾配受型 T-20	個	53,600.00	
033	生コンクリート 13.5N/mm2	m3	12,000.00	
034	生コンクリート 24N/mm2	m3	13,300.00	
035	生コンクリート18-8-40 k	m3	12,600.00	
036	石 材クラッシャーラン 50mm以下	m3	2,000.00	
037	石 材クラッシャーランC-40K	m3	2,000.00	
038	石 材砂 k	m3	3,100.00	

費目別作業単価表

2013年5月6日
1 / 11 ページ

原 区	名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
材料費					
	アスファルト合材	②密粒度AS13 k	m3	8,050	133 株△△商事
	アスファルト混合物	密粒度(13)	t	8,300	
	アスファルト類	AS乳剤 PK-3 k	m3	49	133 株△△商事
	セメント	普通ポルトランド	t	17,600	133 株△△商事
	ダイホリンプレスト管	φ 600 L=4m	m	17,500	
	ダイホリンプレスト管ソケット		個	1,500	
	ボックスカルバート		函	127,000	
	モルタル	1:2	m3	19,000	
	塩化ビニール管	100mm 片受直管 L=4m	本	1,820	133 株△△商事
	塩化ビニール管	300mm 片受直管 L=4m	本	15,000	133 株△△商事
	塩化ビニール管(m)	150mm 片受直管 L=4m	本	4,250	133 株△△商事
	塩化ビニール管(m)	200mm 片受直管 L=4m	本	7,060	133 株△△商事
	下水道資材		m	33	133 株△△商事
	下水道資材	塩ビ管滑材	Kg	860	209 株〇〇建設
	下水道資材	塩ビ管滑材	Kg	860	133 株△△商事
	下水道資材	接着剤	Kg	1,420	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 I	90° 曲管(副管用) DV 100	個	770	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 I	下流用マンホール継手プレーン 150m	個	1,840	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 I	下流用マンホール継手プレーン 200m	個	2,470	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 I	上流用マンホール継手RR 150mm	個	3,140	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 I	上流用マンホール継手RR 200mm	個	4,150	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 I	副管分岐用マンホール継手RR 200m	個	5,180	133 株△△商事
	下水道用塩ビ継手 II	45°、60° 自在曲管RR 100mm	個	2,110	133 株△△商事
	筋芝	10cm	m	16	

工種別作業単価表

2013年5月6日
1 / 44 ページ

0475 管布設工
9307 塩化ビニール管

(1)

原 区	名 称	規 格	単 位	単 価	摘 要
材料費					
	塩化ビニール管(m)	200mm 片受直管 L=4m	本	7,060	133 (有)梅田商事
	塩化ビニール管(m)	150mm 片受直管 L=4m	本	4,250	133 (有)梅田商事
	下水道用塩ビ継手 I	上流用マンホール継手RR 200mm	個	4,150	133 (有)梅田商事
	下水道用塩ビ継手 I	上流用マンホール継手RR 150mm	個	3,140	133 (有)梅田商事
	下水道用塩ビ継手 I	下流用マンホール継手プレーン 200m	個	2,470	133 (有)梅田商事
	下水道用塩ビ継手 I	下流用マンホール継手プレーン 150m	個	1,840	133 (有)梅田商事
	下水道資材	塩ビ管滑材	Kg	860	209 ○○建設
小 計				23,770	
労務費					
	人件費	特殊作業員	人	19,800	209 ○○建設
	人件費	普通作業員	人	16,400	209 ○○建設
小 計				36,200	
合 計				59,970	
